

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD



PROJECT COMPLETION REPORT: IMED-04

Name of the Project: Protection of Brahmaputra River left Bank from Ghughumari to Fuluar Char of Roumari Upazilla and from Rajibpur Upazilla Sadar (Member Para) to Mohonganj Bazar of Rajibpur Upazilla in Kurigram District (1st Revised).

PROJECT PERIOD: April 2019 To June 2025.

DIVISION : KURIGRAM WATER DEVELOPMENT DIVISION, BWDB, KURIGRAM
CIRCLE : RARNGPUR WATER DEVELOPMENT CIRCLE-1, BWDB, RANGPUR.
ZONE : NORTHERN ZONE, BWDB, RANGPUR.

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

০১.	প্রকল্পের নাম	:	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বার পাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন হতে বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প” (১ম সংশোধিত)
০২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
০৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ বিভাগ	:	কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।
০৫.	প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা	:	বিনিয়োগ

০৬.	প্রকল্পের অবস্থান (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	:	
ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	মহানগর/পৌরসভা/উপজেলা
১	রংপুর	কুড়িগ্রাম	রৌমারী ও চর রাজিবপুর

০৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়), বাস্তবায়নকাল এবং অনুমোদন:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মূল	৪৭৯২৩.০০	৪৭৯২৩.০০	-	এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১	০৮-০৭- ২০১৯	-	ECNEC
১ম সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৪৮০৪২.০০	৪৮০৪২.০০	-	এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২	২৩-০৩- ২০২১	১ বছর ও +১১৯.০০	Ministry of Water Resource
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	৪৮০৪২.০০	৪৮০৪২.০০	-	এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩	অনুমোদিত	১ বছর ও ০.০০	Planning Commission
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	৪৮০৪২.০০	৪৮০৪২.০০	-	এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৪	অনুমোদিত	১ বছর ও ০.০০	Planning Commission
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (৩য় বার)	৪৮০৪২.০০	৪৮০৪২.০০	-	এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫	অনুমোদিত	১ বছর ও ০.০০	Planning Commission
অর্থনৈতিক কোড সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	৪৮০৪২.০০	৪৮০৪২.০০	-	এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫	অনুমোদিত	-	Ministry of Water Resource

f

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

৮.১ সার্বিক (যদি থাকে)- কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও চর রাজিবপুর উপজেলায় ব্রক্ষপুত্র নদের বামতীরের ভাঙ্গন রোধ।

৮.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- ব্রক্ষপুত্র নদের ভয়াবহ ভাঙ্গন হতে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘার পাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ৮৩০০.০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্রক্ষপুত্র নদের বামতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।
- নদী ভাঙ্গন রোধের মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ।
- সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।
- প্রকল্পের নিকটবর্তী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।

০৯. প্রকল্পের পটভূমি (সংক্ষিপ্ত)

ব্রক্ষপুত্র নদটি হিমালয় পর্বতমালার কৈলাশ শৃঙ্খের নিকটে মানস সরোবর হতে উৎপন্ন হয়ে তিব্বত এবং ভারতের আসাম রাজ্যের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক নদী যা উৎপস্থিত হতে বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়া পর্যন্ত ২৮৫০ কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করেছে। গোয়ালন্দে গঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্রক্ষপুত্র যমুনা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪০ মিটার। ব্রক্ষপুত্র নদ ভারতের ভবানীপুরের পূর্ব প্রান্ত এবং বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার উত্তর পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রকৃতিগতভাবে এটি একটি বিনুনি (Braided) নদ।

ব্রক্ষপুত্র নদটি একাধিক চ্যানেলে বিভক্ত হয়ে ভারতের আসাম রাজ্য হতে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। ব্রক্ষপুত্র নদের পূর্বপ্রান্তে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলা ০২ টির অবস্থান এবং উপজেলা ২ টির স্থলভাগ গড়ে প্রায় ৫.০০ কিঃমিঃ প্রশস্ত, যার পূর্বপ্রান্তে ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত। এ কারনে উপজেলা ২ টির অবস্থান বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাসহ সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রক্ষপুত্র নদের সর্ববামের চ্যানেলটি রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত। প্রতি বছর বন্যা ও বন্যার পরবর্তী সময়ে এ এলাকার ব্যাপক নদী ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে উক্ত এলাকার সরকারী ও বে-সরকারী বহু স্থাপনা ও ফসলী জমি নদ গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অব্যাহত নদ ভাঙ্গনের ফলে উক্ত এলাকার নিম্ন আয়ের মানুষ প্রতিনিয়ত নিঃশ্ব হয়ে পড়েছে। যে কারনে অত্র এলাকার নদ-নদী ভাঙ্গনরোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় বাংলাদেশের মানচিত্র পরিবর্তন ঘটানোর আশংকা রয়েছে। বিগত কয়েক বছরের ব্রক্ষপুত্র নদের অব্যাহত ভাঙ্গনে রৌমারী উপজেলার ফুলুয়ার চর, কর্তিমারী, রাজীবপুর উপজেলার উপজেলা সদর ও মোহনগঞ্জ এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গনে প্রসিদ্ধ এবং জনগুরুত্বপূর্ণ অনেক সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা নদের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসী, স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সর্বস্তরের জনগণের অব্যাহত দাবীর মুখে উক্ত এলাকাসমূহে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের জন্য বাপাউবো (সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০০২(৯ম খন্ড)/১০ তারিখঃ ১৪-০১-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিগত ১৮-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনপূর্বক কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী ও বলদমারা এবং রাজিবপুর উপজেলার মেঘারপাড়া হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রক্ষপুত্র নদের বামতীর ভাঙ্গন হতে বিস্তীর্ণ এলাকা রক্ষার জন্য স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিপিপি প্রনয়নের জন্য সুপারিশ করেন, যা বোর্ড সচিবালয় স্মারক নং- বাপাউবো (সচি)/পরি-১/কাপ্র-২০১৬/২৫৬ তারিখঃ ১১-১২-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক দাখিলকৃত প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত সুপারিশের আলোকে “কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রক্ষপুত্র নদের ভাঙ্গন হতে বামতীর সংরক্ষণ ” শীর্ষক প্রকল্পটি ০৯-০৪-২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদনের পর পরিকল্পনা কমিশনের ০৮-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখের ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৩৬.১৯-১৬৪, নম্বর স্মারকমূলে জিও জারি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৯-০৭-০১৯ তারিখের ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-১২৩ নম্বর

স্মারকমূলে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৭৯২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল ০১ এপ্রিল/২০১৯ হতে ৩০ জুন/২০২১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৩-০৩-২০২১ তারিখের ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-২৩৭ নম্বর স্মারকমূলে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৮০৪২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১৯ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৩ দফায় বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) অনুমোদিত হয়েছে।

১০. প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ৮৩০০.০০ মিটার।
- আরসিসি ঘাটলা নির্মাণ- ৪ টি।

১১. প্রকল্প সংশোধনের কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

- প্রকল্পের ভাটিতে চর রাজিবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ এলাকা নদীতীর সংরক্ষণ কাজের সংস্থান সমাপ্ত হলেও কল্লটি বাস্তবায়ন করা হলেও প্রকল্পের পূর্ণ সুফল পেতে হলে প্রকল্পের ভাটিতে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ প্রায় ১.০০ কিঃ মিঃ বর্ধিত করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এছাড়া নতুন কাজের অর্থ সিংহভাগ অর্থ প্রকল্পের সাশ্রয়কৃত অর্থ হতে সংস্থাপন করা হয়েছে।
- ১ম সংশোধনঃ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ হতে জুন ২০২২ খ্রিঃ

১২. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

- প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছিল প্রত্যন্ত এলাকা। বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মালামাল, যন্ত্রপাতি সববরাহ করতে বেগ পেতে হয়েছিল।
- প্রকল্পের তহবিলের স্বল্পতার কারণে প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় বাড়ানো হয়েছিল এবং নতুন বাস্তবায়ন সময়কাল ছিল এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ হতে জুন ২০২৫ খ্রিঃ।

১৩. প্রকল্পের অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়):

উৎস ধরন	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫) = (২+৩+৪)
বিনিয়োগ				
ঋণ				
ইকুইটি				
অনুদান	৪৮০৪২.০০			৪৮০৪২.০০
অন্যান্য				
মোট	৪৮০৪২.০০			৪৮০৪২.০০

f

খ. বাস্তবায়ন অবস্থা

১৪. বাস্তবায়নকাল:

অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল মেয়াদের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ হতে জুন ২০২২ খ্রিঃ	এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ হতে জুন ২০২৫ খ্রিঃ	এপ্রিল ২০১৯ খ্রিঃ হতে জুন ২০২৫ খ্রিঃ	+ ১০৯৫.০০ (+ ৯২.৩৩%)	

১৫. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়):

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল ব্যয়ের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
৪৭৯২৩.০০	৪৮০৪২.০০	৪৬৪৩৩.৩৬ (৯৬.৬৫%)	+ ১১৯.০০ (+ ০.২৪৮%)	

১৬. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমানুসারে):

নাম, আইডি, মূল পদবি, গ্রেড ও মোবাইল নম্বর	দায়িত্বের ধরণ		একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত (হ্যাঁ/না)	সময়কাল (তারিখ)		মন্তব্য
	পূর্ণকালীন (হ্যাঁ/না)	অতিরিক্ত দায়িত্ব (হ্যাঁ/না)		যোগদান	অবমুক্তি	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
জনাব মোঃ হারুন-অর-রশীদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গ্রেড: ৪র্থ	না	অতিরিক্ত	না	০১/০৮/২০১৯খ্রিঃ	২৬/০৫/২০২০খ্রিঃ	
জনাব মোঃ আব্দুস শহীদ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গ্রেড: ৪র্থ	না	অতিরিক্ত	না	২৮/০৮/২০২০খ্রিঃ	২৩/১২/২০২১খ্রিঃ	
জনাব খুশী মোহন সরকার তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গ্রেড: ৪র্থ	না	অতিরিক্ত	না	২৪/০৩/২০২২খ্রিঃ	১০/০১/২০২৩খ্রিঃ	
জনাব মোঃ আহসান হাবীব তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গ্রেড: ৪র্থ মোবাইল: ০১৭১৮১৪৫৩০৫	না	অতিরিক্ত	না	০৭/০২/২০২৩খ্রিঃ	৩০/০৬/২০২৫খ্রিঃ	

১৭. প্রকল্পের জনবল:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল:

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	বাস্তবায়নকালে নিয়োগকৃত জনবল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	নকশা প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
২	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
৩	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
	পরিকল্পনা প্রকৌশলী		নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
২	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
৩	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
	মাঠ কর্মকর্তা		নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
১	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
২	নির্বাহী প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
৩	উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী	২	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
৪	সহকারী প্রকৌশলী	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
৫	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	৫	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
৬	সার্ভেয়ার	২	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
৭	কার্য সহকারী	৫	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
৮	ক্লার্ক	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
৯	হিসাব করনিক	১	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
১০	এম এল এস এস	৪	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
১১	গার্ড / চৌকিদার	৪	নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে
মোট =		৩৩	

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় জনবলের তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ক্রমিক নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে (হ্যাঁ/না)	নিয়োগ সম্পন্ন না হলে তার কারণ ও সর্বশেষ অবস্থা
	পদের নাম ও গ্রেড	সংখ্যা		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
মোট				

১

১৮. প্রশিক্ষণ (স্থানীয়/বৈদেশিক):

ধরন	ক্রমিক নং	দিন/সপ্তাহ/মাস, ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা					
		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অর্জন		
		দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
স্থানীয় প্রশিক্ষণ							
উপমোট							
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ							
উপমোট							
মোট							

১৯. অ্যাডভান্স লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী):

অংশের নাম	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব/	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:										
সরবরাহ সেবাঃ-										
সম্মানী ভাতা/ফি/ পারিশ্রমিক (বিভিন্ন কমিটির জন্য)	থোক	থোক	১০.০০	১০.০০			৯.২৯	৯.২৯		
সম্মানী ভাতা/ফি/ পারিশ্রমিক (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন বাবদ)	থোক	থোক	৮.০০	৮.০০			৮.০০	৮.০০		
শ্রমিক মজুরি	থোক	থোক	১০.০০	১০.০০			৯.৯৪	৯.৯৪		
প্রচার ও বিজ্ঞাপন	থোক	থোক	৩.০০	৩.০০			২.৯৯	২.৯৯		
সেমিনার, কনফারেন্স	থোক	থোক	৪.০০	৪.০০			৩.৯৯	৩.৯৯		
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (অভিজ্ঞতা শেয়ারের লক্ষ্যে বৈদেশিক সফর)	২৫ জন	২৫ জন	১৩০.০০	১৩০.০০			০.০০	০.০০		
গ্যাস ও জ্বালানী	থোক	থোক	৬.০০	৬.০০			২.৮৮	২.৮৮		
পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	থোক	থোক	১০.০০	১০.০০			৯.৮৭	৯.৮৭		
অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	থোক	থোক	১০.০০	১০.০০			৭.৩৫	৭.৩৫		
স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প	থোক	থোক	৮.০০	৮.০০			৭.৯৯	৭.৯৯		
সার্ভে	থোক	থোক	১০.০০	১০.০০			৯.৯৯	৯.৯৯		
মেরামত ও সংরক্ষণ										

অংশের নাম	একক	পরিমান	প্রাকলিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
যানবাহন (জীপ ৩টি এবং মোটরসাইকেল ৬টি)	৯টি	৯টি	৩.০০	৩.০০			২.৯৯	২.৯৯		
ভবন মেরামত/রিনোভেশন	থোক	থোক	২০.০০	২০.০০			১৮.৯৭	১৮.৯৭		
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)			২৩২.০০	২৩২.০০			৯৪.২৫	৯৪.২৫		
(খ) মূলধন										
মোটরযান (ডাবল কেবিন পিক-আপ)	সংখ্যা	১	৫৫.০০	৫৫.০০			০.০০	০.০০		
জলযান (স্পীড বোট, ইঞ্জিন ও আনুসঙ্গিকসহ)	সংখ্যা	১	২৪.৮৯	২৪.৮৯			২৪.৮৯	২৪.৮৯		
মোটরযান -মোটর সাইকেল (১৫০সিসি)	সংখ্যা	২	৩.০০	৩.০০			৩.০০	৩.০০		
নির্মাণ ও পূর্ত:										
নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ (৮.৩০ কিঃমিঃ)	মিটার	৮৩০০	৪৭৬১১.১১	৪৭৬১১.১১			৪৬২৯৮.৯০	৪৬২৯৮.৯০		
আর.সি.সি ঘাটলা নির্মাণ (৪ টি লোকেশনে)	সংখ্যা	৪	১৬.০০	১৬.০০			১২.৩২	১২.৩২		
উপমোট (মূলধন ব্যয়):			৪৭৭১০.০০	৪৭৭১০.০০			৪৬৩৩৯.১২	৪৬৩৩৯.১২		
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন):			৪৭৯৪২.০০	৪৭৯৪২.০০			৪৬৪৩৩.৩৬	৪৬৪৩৩.৩৬		
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০		
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি			৫০.০০	৫০.০০			০.০০	০.০০		
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় [(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)]=			৪৮০৪২.০০	৪৮০৪২.০০			৪৬৪৩৩.৩৬	৪৬৪৩৩.৩৬		

২০. যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত:

যানবাহনের ধরন	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয়ের সংখ্যা ও ক্রয়ের তারিখ	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পূলে হস্তান্তরের সংখ্যা ও তারিখ	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	বাতিল ঘোষণা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	পরবর্তীতে ফেরৎ/স্থানান্তর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
জীপ							
মাইক্রোবাস							
পিক-আপ	১টি						ক্রয় স্থগিত রয়েছে।
ট্রাক							
মোটর সাইকেল	২টি	২টি ১০-০৪-২০২০খ্রিঃ					
বাইসাইকেল							
স্পিডবোট	১টি	১টি ১০-০৪-২০২০খ্রিঃ					
অন্যান্য							

৫

২১. প্রকল্পের পরামর্শক সংক্রান্ত (স্থানীয়/বৈদেশিক):

পরামর্শকের ধরন	জন-মাস		প্রকৃত জন-মাস এর তথ্য	ডেলিভারেবলের সংখ্যা		মন্তব্য
	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	প্রকৃত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক) স্থানীয়						
খ) বৈদেশিক						

২২. অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি স্থাপন:

অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির বিবরণ	পরিমাণ (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	ক্রয়ের পরিমাণ (তারিখসহ)	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের তারিখ	বিধি অনুযায়ী বাতিল ঘোষণার তারিখ	অবশিষ্ট	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)

২৩. পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

২৩.১ প্যাকেজসমূহের এর তথ্য:

ক) প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ২৮টি; তার মধ্যে পণ্য ২টি, কার্য ২৬টি ও সেবা ০টি।

খ) ক্রয়কৃত মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ২৮টি; তার মধ্যে পণ্য ২টি, কার্য ২৬টি ও সেবা ০টি।

গ) কোন প্যাকেজের ক্রয় সম্পন্ন না হলে তার কারণ (যদি থাকে): ডাবল কেবিন পিকআপ (প্যাকেজ: জি-১): মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক ক্রয় স্থগিত রয়েছে।

ঘ) যে সকল প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য প্রকল্পের মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্যের ১% এর বেশী তার সংখ্যা: ২৪টি; তার মধ্যে পণ্য ০টি, কার্য ২৪টি ও সেবা ০টি।

২৩.২ প্যাকেজ ভিত্তিক পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের তথ্য (প্রতি ক্ষেত্রে ব্যয়ের ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ ৫০টি প্যাকেজ): সংযুক্তি -ক, সংযুক্তি -খ এবং সংযুক্তি-গ অনুযায়ী তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।

গ. আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

২৪. মূল এবং সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের বছরভিত্তিক আর্থিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (মূল প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)				আর্থিক ও বাস্তব অর্জন (সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)			
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন/ অন্যান্য	বাস্তব (%)	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন/ অন্যান্য	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১৮-২০১৯	০.০০	০.০০	-	০.০০%	০.০০	০.০০	-	০.০০%
২০১৯-২০২০	৬৫৩.৮৫	৬৫৩.৮৫	-	১.৩৬%	৬৫৩.১৬	৬৫৩.১৬	-	১.৪১%
২০২০-২০২১	২৩৮৩৭.০২	২৩৮৩৭.০২	-	৪৯.৬২%	৫৬১৫.৯৭	৫৬১৫.৯৭	-	১২.০৯%
২০২১-২০২২	২৩৫৫১.১৩	২৩৫৫১.১৩	-	৪৯.০২%	১৭৯৯৪.৯১	১৭৯৯৪.৯১	-	৩৮.৭৫%
২০২২- ২০২৩	-	-	-	-	৯৯৯৭.১১	৯৯৯৭.১১	-	২১.৫৩%
২০২৩-২০২৪	-	-	-	-	১০০০৩.২০	১০০০৩.২০	-	২১.৫৪%
২০২৪-২০২৫	-	-	-	-	২১৬৯.০১	২১৬৯.০১	-	৪.৬৭%
সর্বমোট=	৪৮০৪২.০০	৪৮০৪২.০০	-	১০০.০০%	৪৬৪৩৩.৩৬	৪৬৪৩৩.৩৬	-	১০০.০০%

২৫. সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অর্জন:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা				অর্থছাড় জিওবি	আর্থিক ও বাস্তব অর্জন				অব্যয়িত ছাড়কৃত জিওবি
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)		মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
২০১৮- ২০১৯	০.০০	০.০০	-	০.০০%	০.০০	০.০০	০.০০	-	০	০.০০
২০১৯- ২০২০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-	৪.০০%	৬৫৩.১৬	৬৫৩.১৬	৬৫৩.১৬	-	৪.০০%	০.০০
২০২০- ২০২১	৯০০০.০০	৯০০০.০০	-	৩০.০০%	৫৬১৫.৯৭	৫৬১৫.৯৭	৫৬১৫.৯৭	-	২৫.৩১%	০.০০
২০২১- ২০২২	১৮০০০.০০	১৮০০০.০০	-	৩০.০০%	১৮০০০.০০	১৭৯৯৪.৯১	১৭৯৯৪.৯১	-	৩৫.১২%	৫.০৯
২০২২- ২০২৩	১০০০০.০০	১০০০০.০০	-	২০.০০%	১০০০০.০০	৯৯৯৭.১১	৯৯৯৭.১১	-	১৯.৫৭%	২.৮৯
২০২৩- ২০২৪	১০৫০০.০০	১০৫০০.০০	-	১২.০০%	১০৫০০.০০	১০০০৩.২০	১০০০৩.২০	-	১২.০০%	৪৯৬.৮
২০২৪- ২০২৫	২৩৮০.০০	২৩৮০.০০	-	৪.০০%	২৩৮০.০০	২১৬৯.০১	২১৬৯.০১	-	৪.০০%	২১০.৯৯
সর্বমোট=	৫০৬৩০.০০	৫০৬৩০.০০	-	১০০.০০%	৪৭১৪৯.১৩	৪৬৪৩৩.৩৬	৪৬৪৩৩.৩৬	-	১০০.০০%	৭১৫.৭৭

f

ঘ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

২৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকৃত অর্জন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ঘাটতির কারণ (যদি থাকে):

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
১। ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়াবহ ভাঙ্গন হতে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘার পাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ৮৩০০.০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়াবহ ভাঙ্গন হতে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘার পাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ৮৩০০.০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে।	
২। নদী ভাঙ্গন রোধের মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ।	নদী ভাঙ্গন রোধের মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র দূরীকরণ হয়েছে।	
৩। সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।	সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা হয়েছে।	
৪। প্রকল্পের নিকটবর্তী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা।	প্রকল্পের নিকটবর্তী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা হয়েছে।	

ঙ. বেনিফিট বিশ্লেষণ

২৭. বার্ষিক আউটপুট:

আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর ১ম বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
Agricultural land	ha.	5650	5650
Pacca House (1-Storied)	nos.	65	65
Pacca House (2-Storied)	nos.	25	25
Semi Pacca House	nos.	745	745
Kacha House	nos.	5750	5750
Pacca Road	Km.	65	65
Katcha Road	Km.	129	129
Bridge/Culvert/Regulator	nos.	65	65
Hat/Bazar	nos.	6	6
Mosque	nos.	51	51
Primary School/High School	nos.	59	59
College	nos.	6	6
Madrasha	nos.	15	15
Brick Field	nos.	7	7
Health Complex	nos.	3	3
Police Station	no.	1	1
Food Godown	no.	1	1
B.G.B Camp	no.	1	1
Technical College	no.	1	1
Veterinary Office	no.	1	1
Sub-Register Office	no.	1	1

২৮. কস্ট বেনিফিট:

বিবরণ	প্রাক্কলিত	প্রকৃত
(১) প্রকল্পের বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক	- ২.৬৬ : ১.০০	এটি পরবর্তীতে BWDB ও IMED- এর সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তর কর্তৃক মূল্যায়ন করা হবে।
(২) ইনটারনাল রোট অব রিটার্ন (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক	- ৩৪.৭৪%	

২৯. প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত বেনিফিটের মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে তার কারণ উল্লেখ করুন: কোনো ঘাটতি নেই।

চ. পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ

৩০. প্রকল্প বাস্তবায়নকালের পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত:

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ক) আইএমইডি	০২/১১/২০২৪ খ্রি:		(ক) বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের যাবতীয় বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ইতোপূর্বে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার নির্ধারিত মাইলস্টোন অর্জন অর্জন নিশ্চিত করতে হবে এবং সময়ে সময়ে তা আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে;	বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের যাবতীয় বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য ইতোপূর্বে প্রণীত কর্মপরিকল্পনার নির্ধারিত মাইলস্টোন অর্জন নিশ্চিত করা হয় এবং তা সময়ে সময়ে আইএমইডিকে অবহিত করা হয়।
			(খ) প্রকল্পের পূর্ত কাজ নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন নিমিত্ত অগ্রগতি মন্তব্য সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট প্যাকেজ (১৫ ও ১৭ নং) নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, মালামাল ও লোকবল সরবরাহসহ যাবতীয় মোবাইলাইজেশন কার্যক্রম বৃদ্ধি করতে হবে;	প্রকল্পের পূর্ত কাজ নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন নিমিত্ত অগ্রগতি মন্তব্য সম্পন্ন সংশ্লিষ্ট প্যাকেজ (১৫ ও ১৭ নং) নিয়োজিত ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, মালামাল ও লোকবল সরবরাহসহ যাবতীয় মোবাইলাইজেশন কার্যক্রম বৃদ্ধি করে কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।
			(গ) প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে অর্থাৎ জুন ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান নিশ্চিত করতে হবে	প্রস্তাবিত বর্ধিত মেয়াদে অর্থাৎ জুন ২০২৫ এর মধ্যে প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্পের অনুকূলে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান বৃদ্ধি করে কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে।
			(ঘ) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্নসহ উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;	(ঘ) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের অডিট কার্যক্রম সম্পন্নসহ উত্থাপিত অডিট আপত্তিসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

f

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
			(ঙ) অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক প্রকল্পের সকল কাজের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে;	অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন মোতাবেক প্রকল্পের সকল কাজের বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা হয়েছে।
			(চ) এ প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে আইএমইডি-কে লিখিতভাবে অবহিত করতে হবে; এবং	প্রতিবেদনে বর্ণিত সুপারিশ/মতামতের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে আইএমইডি-কে লিখিতভাবে অবহিত করা হয়েছে।
			(ছ) ভবিষ্যতে এ প্রকল্পের মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না।	উক্ত প্রকল্প অনুমোদিত সময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।
খ) মন্ত্রণালয়/সংস্থা:				
গ) অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে) বিডব্লিউডিবি		প্রকল্পের ৯টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে।	চলমান প্যাকেজসমূহ অতিদ্রুত Design and Specification অনুযায়ী সম্পন্ন করা প্রয়োজন।	Design and Specification অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।
		ঢালে (স্লোপে) বিদ্যমান স্যান্ড-সিমেন্ট জিও- ব্যাগ উল্টিয়ে এর গুনগত মান যাচাই করা হয়।	পর্যাপ্ত পানি দিয়ে কিউরিং এর ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।	পর্যাপ্ত পানি দিয়ে কিউরিং এর ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
		স্লোপে জিও-ব্যাগের প্রেসিং-এর ক্ষেত্রে কিছু স্থানে কম ওভার ল্যাপিং পরিলক্ষিত হয়	ডিজাইন অনুযায়ী যথাযথ ওভার-ল্যাপিং বজায় রাখতে হবে।	অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী যথাযথ ওভার-ল্যাপিং করা হয়েছে।
		পরিদর্শনকালে স্লোপের ব্লকের নিম্নতলে ফিল্টার ম্যাটেরিয়ালের উপস্থিতি যাচাই করা হয়।	স্লোপের ব্লকের নিম্নতলে ফিল্টার ম্যাটেরিয়াল (খোয়া, বালি, জিও ফিল্টার) পাওয়া গিয়েছে।	অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী খোয়া, বালি, জিও ফিল্টার ব্যবহার করে কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
		প্রকল্পে এন্ড টার্মিনেশন- এর কাজ বিদ্যমান।	এন্ড টার্মিনেশন-এর কাজগুলোতে যথাযথভাবে ডিজাইন অনুযায়ী ট্রানজিসন বজায় রেখে করতে হবে এবং ব্লক প্লেসিং এর জন্য যেন নদী কাছে আসার চ্যানেল সৃষ্টি না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।	অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী প্রকল্পে এন্ড টার্মিনেশন-এর কাজ সমাপ্ত করা হয়।

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
		অধিকাংশ স্থানে চর পড়ে যাওয়ায় লক্ষিৎ ম্যাটেরিয়াল পুরোপুরি দৃশ্যমান নয়।	নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারণে চর পড়েছে।	নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের কারণে চর পড়েছে। আপাতত উক্ত এলাকায় ভাঙনের ঝুঁকি নাই।
		পরিদর্শনকালে নির্মাণ- সমাপ্ত ঘাটলার উপরের সমতল ও সংলগ্ন নদী তীরের মাটির রাস্তার সমতলে পার্থক্য বিদ্যমান	নিরাপদে ঘাটলা ব্যবহারের জন্য বর্তমান তীরের সমতল ও ঘাটলার উপরের সমতল কাছাকাছি করতে হবে।	জনসাধারণের ব্যবহান উপযোগি করে নিরাপদ ঘাটলা তৈরি করা হয়।
		প্রকল্প এলাকায় অরক্ষিত অবস্থায় সরাসরি সূর্যালোকের নিচে বালু ভর্তি জিওব্যাগ দৃশ্যমান হয়।	টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনা সাপেক্ষে অতিদ্রুত নকশানুযায়ী জিওব্যাগগুলো ডাম্পিং করতে হবে এবং কোন অবস্থাতেই সরাসরি সূর্যালোকের নিচে রাখা যাবে না।	টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনা সাপেক্ষে অতিদ্রুত নকশানুযায়ী জিওব্যাগগুলো ডাম্পিং করা হয় এবং সরাসরি সূর্যের আলো পড়ে না।
		প্রতিরক্ষা কাজের দুই- এক স্থানে স্লোপ কিছুটা বসে গেছে।	এসব স্লোপ অতিদ্রুত মেরামত করতে হবে।	প্রতিরক্ষা কাজের দুই-এক স্থানে ক্ষতিগ্রস্ত স্লোপ মেরামত করা হয়েছে।
		পরিদর্শনকালে কাজের সাইনবোর্ড পরিলক্ষিত হলেও কি.মি. পোস্ট লক্ষ্য করা যায় নি।	নকশা অনুযায়ী কি.মি. পোস্ট নির্মাণ করা প্রয়োজন।	নকশা অনুযায়ী কি.মি. পোস্ট নির্মাণ করা হয়েছে।

৩১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও সমাপ্তির পর নিরীক্ষণ সংক্রান্ত:

(ক) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
মোট আপত্তির সংখ্যা ও আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ				

(খ) বহিঃনিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	২০২৩-২৪	২৬-১১-২৪	Bank Revetment Work on the Right Bank of Brahmaputra River from km 67.040 to km 67.640 = 600m at Jorgach area in Union Romna, Upazila-chilmari District- kurigram 2,96,91061.00 taka	নিষ্পত্তি হয়নি (জবাব প্রেরণ করা হয়েছে)
২	২০২৩-২৪	২৬-১১-২৪	Bank Revetment Work on the Right Bank of Brahmaputra River from km 53.000 to km 53.200 = 200m in Upazila-Ulipur District- kurigram. 3,04,36,576.00 taka	নিষ্পত্তি হয়নি (জবাব প্রেরণ করা হয়েছে)
মোট আপত্তির সংখ্যা ও আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ			২টি ও টাকার পরিমাণ = ৬,০১,২৭,৬৩৭.০০ /=	

ছ. প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মন্তব্য

৩২. প্রকল্পের বিষয়ে সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩২.১. পটভূমি

পর্যন্ত ২৮৫০ কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করেছে। গোয়ালন্দে গঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র যমুনা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪০ মিটার। ব্রহ্মপুত্র নদ ভারতের ভবানীপুরের পূর্ব প্রান্ত এবং বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার উত্তর পূর্ব প্রান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রকৃতিগতভাবে এটি একটি বিনুনি (Braided) নদ। ব্রহ্মপুত্র নদটি একাধিক চ্যানেলে বিভক্ত হয়ে ভারতের আসাম রাজ্য হতে বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলায় প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্বপ্রান্তে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলা ০২ টির অবস্থান এবং উপজেলা ২ টির স্থলভাগ গড়ে প্রায় ৫.০০ কিঃমিঃ প্রশস্ত, যার পূর্বপ্রান্তে ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত। এ কারণে উপজেলা ২ টির অবস্থান বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাসহ সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ব্রহ্মপুত্র নদের সর্ববামের চ্যানেলটি রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলার পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে প্রবাহিত। প্রতি বছর বন্যা ও বন্যার পরবর্তী সময়ে এ এলাকার ব্যাপক নদী ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে উক্ত এলাকার সরকারী ও বেসরকারী বহু স্থাপনা ও ফসলী জমি নদ গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অব্যাহত নদ ভাঙ্গনের ফলে উক্ত এলাকার নিম্ন আয়ের মানুষ প্রতিনিয়ত নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। যে কারণে অত্র এলাকার নদ-নদী ভাঙ্গনরোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় বাংলাদেশের মানচিত্র পরিবর্তন ঘটানোর আশংকা রয়েছে। বিগত কয়েক বছরের ব্রহ্মপুত্র নদের অব্যাহত ভাঙ্গনে রৌমারী উপজেলার ফুলুয়ার চর, কর্তিমারী, রাজীবপুর উপজেলার উপজেলা সদর ও মোহনগঞ্জ এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গনে প্রসিদ্ধ এবং জনগুরুত্বপূর্ণ অনেক সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা নদের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। এলাকাবাসী, স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সর্বস্তরের জনগণের অব্যাহত দাবীর মুখে উক্ত এলাকাসমূহে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের জন্য বাপাউবো (সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০০২(৯ম খন্ড)/১০ তারিখঃ ১৪-০১-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিগত ১৮-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনপূর্বক কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী ও বলদমারা এবং রাজীবপুর উপজেলার মেঘারপাড়া হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর ভাঙ্গন হতে বিস্তীর্ণ এলাকা রক্ষার জন্য স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করেন, যা বোর্ড সচিবালয় স্মারক নং- বাপাউবো (সচি)/পরি-১/কাপ্র-২০১৬/২৫৬ তারিখঃ ১১-১২-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক দাখিলকৃত প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত সুপারিশের আলোকে “কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজীবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন হতে বামতীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটি ০৯-০৪-২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদনের পর পরিকল্পনা কমিশনের ০৮-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখের ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৩৬.১৯-১৬৪, নম্বর স্মারকমূলে জিও জারি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৯-০৭-০১৯ তারিখের ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-১২৩ নম্বর স্মারকমূলে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৭৯২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল ০১ এপ্রিল/২০১৯ হতে ৩০ জুন/২০২১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৩-০৩-২০২১ তারিখের ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-২৩৭ নম্বর স্মারকমূলে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৮০৪২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১৯ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৩ দফায় বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) অনুমোদিত হয়েছে।

৩২.২. যৌক্তিকতা/পর্যাপ্ততা

ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বতের মানস সরোবর হতে উৎপত্তি হয়ে ভারতের আসাম রাজ্যের মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এটি একটি আন্তর্জাতিক নদী যা উৎপত্তি স্থল থেকে বঙ্গোপসাগরে পতিত হওয়া পর্যন্ত ২৮৫০ কিঃমিঃ পথ অতিক্রম করেছে। গোয়ালন্দে গঙ্গা নদীর সাথে মিলিত হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর দৈর্ঘ্য প্রায় ২৪০ কিঃমিঃ। ব্রহ্মপুত্র নদ ভারতের ভবানীপুরের পূর্ব প্রান্ত এবং বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার উত্তর-পূর্ব প্রান্ত দিয়ে প্রবেশ করেছে। প্রকৃতিগত ভাবে এটি একটি বিনুনি (Braided) নদ। বন্যায় সময় ব্রহ্মপুত্র নদের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য চর/ডুবোচর পড়ে ব্যাপক Morphological পরিবর্তন হয়। এতে করে নদীর প্রবাহের গতিপথ পরিবর্তিত হয়ে কখনো ডানতীর কখনো বামতীর বরাবর প্রবাহিত হচ্ছে। চরের প্রভাবে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়। বর্তমানে নদীর একটি মূল প্রবাহ বামতীর ঘেষে প্রবাহিত হয়ে রৌমারী এবং রাজীবপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ভাঙ্গন সংগঠিত হচ্ছে। প্রায় শতাধিক কাঁচাপাকা ঘরবাড়ি, মসজিদ, পাকা ও কাচা রাস্তাসহ কয়েক শত একর ফসলি জমি ভাঙ্গনের কবলে পড়েছে।

৩২.৩ উদ্দেশ্য

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ এবং বিভিন্ন নদীর তীর ভাঙন একটি নিয়মিত ঘটনা। প্রতি বছর বর্ষা ও বর্ষা-পরবর্তী সময়ে পানির প্রবল স্রোত এবং স্বাভাবিক পানিপ্রবাহ ও আকস্মিক পানিপ্রবাহের মধ্যে বড় ধরনের তারতম্যের কারণে বাংলাদেশের বালি/পলিমাটিযুক্ত ভূমিতে নদীভাঙন প্রকৃতির একটি জটিল ও গতিশীল প্রক্রিয়া। প্রধান নদীগুলোর বর্ষার পানিপ্রবাহ এতটাই বেশি যে প্রতি বছরই বন্যার পুনরাবৃত্তি ঘটে। কখনও কখনও এটি খুব মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং বিধ্বংসী নদীভাঙনের ফলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। এর উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রয়েছে। জমি, ফসল ও সম্পত্তির ক্ষতির ফলে নদীর তীরবর্তী হাজার হাজার অধিবাসী ভূমিহীন ও দরিদ্র হয়ে পড়েছে। নদীপ্রবাহের এই ব্যাপক মৌসুমী তারতম্যের ফলে পলি পরিবহনের ক্ষমতা পরিবর্তিত হয় এবং এর কারণে নদীভাঙন, নদী তীরের স্থান পরিবর্তন এবং নদীখাতের সর্পিল গতিপথ সৃষ্টি হয়। এই প্রেক্ষাপটে, উপজেলা শহর, অবকাঠামো, হাট ও বাজার, স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা এবং কৃষি জমি রক্ষার অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাজনৈতিক সুবিধাগুলো নিয়ে উদ্বেগ ও পুনর্মূল্যায়ন ক্রমশ বাড়ছে। পানি খাতের জাতীয় পরিকল্পিত দলিলে বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং শীর্ষ পর্যায়ে নদী তীর সুরক্ষা, নদী পুনঃখনন ও বীধ পুনঃবিভাগীকরণ কর্মসূচির পর্যায়ক্রমিক বাস্তবায়নের জন্য নদী তীরের অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৌশলগত স্থানগুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির সার্বিক উদ্দেশ্য হলো নদী ভাঙন রোধের মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ এবং এলাকার জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা।

৩২.৪ প্রকল্প সংশোধন এ তার কারণ সম্পর্কিত:

“কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন হতে বামতীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটি ০৯-০৪-২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদনের পর পরিকল্পনা কমিশনের ০৮-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখের ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৩৬.১৯-১৬৪, নম্বর স্মারকমূলে জিও জারি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৯-০৭-০১৯ তারিখের ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-১২৩ নম্বর স্মারকমূলে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৭৯২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল ০১ এপ্রিল/২০১৯ হতে ৩০ জুন/২০২১ পর্যন্ত। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীরে অবস্থিত রৌমারী উপজেলার বলদমারা ও রাজিবপুর উপজেলার মেম্বারপাড়া, মোহনগঞ্জ বাজার সংলগ্ন বিভিন্ন এলাকার জনসাধারণের মূল্যবান সহায় সম্পত্তি, স্কুল কলেজ, মসজিদ মাদ্রাসা, ফসলী জমি, ব্রীজ কালভার্ট, নদী বন্দর, সরকারী-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা পাবে মর্মে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল। প্রকল্পটি অনুমোদনের পর গত ০১-০৮-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ করা হয়। প্রকল্পের কাজ সৃষ্টভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রংপুর পওর সার্কেল-১ এর রোট সিডিউল ২০১৮-২০১৯ অনুযায়ী প্রথম দফায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ডিপিপি ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ১৯টি প্যাকেজের মধ্যে ১৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। ডিপিপি ২০১৭-১৮ সালের রোট সিডিউলের দর ব্যবহৃত হয়েছিল ইতোমধ্যে বাপাউবোর রোট সিডিউল দুই বার পরিবর্তিত হয়। ফলে ১৯টি প্যাকেজের মধ্যে ১৫ টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয় যার ব্যয় প্রায় ৪০৯৬০.৫৩ লক্ষ টাকা। সাশ্রয়ী অর্থ প্রায় ৬৫৩১.৭১ লক্ষ টাকার মাধ্যমে বাকি ৪টি প্যাকেজের মধ্যে উজানের ৫০০ মিটারের ১টি প্যাকেজের ও ভাটির এন্টারমিনেশনের ১টি প্যাকেজের (মোট ২টি প্যাকেজের) ক্ষেত্রে সময় করা গেলেও বাকি ২টি প্যাকেজের জন্য অতিরিক্ত আরো প্রায় ৪৭৮৫.২৭ লক্ষ টাকার প্রয়োজন। জরুরি ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার হয়। প্রকল্পের ভাটিতে মোহনগঞ্জ অংশে প্রায় ২.৩০০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজের সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হলেও প্রকল্পের পূর্ণ সুফল পেতে হলে প্রকল্পের ভাটিতে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ প্রায় ১.০০ কিঃ মিঃ বর্ধিত করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, বিষয়োক্ত প্রকল্পের উপর গত ০৬-০১-২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও বাস্তবায়নের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত সভায় মোহনগঞ্জের ভাটিতে ভাঙন কবলিত ১০০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করা হলে বোর্ড কর্তৃক কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে উক্ত স্থান নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সচিবালয় স্মারক নং- বাপাউবো(সচি)পরি-১/বিবিধ-৩/২০২০(১ম খন্ড)/৩৫, তারিখ : ১৮-০২-২০২০ খ্রিঃ। মোতাবেক “কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙন হতে বামতীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে ডিপিপি সংশোধন/আন্তঃখাত সময়ের লক্ষ্যে কারিগরী প্রতিবেদন” তরীর জন্য ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কারিগরি কমিটি প্রকল্পের ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধিসহ মোহনগঞ্জ এলাকায় অতিরিক্ত ১০০০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের সুপারিশ করেছেন। কারিগরি প্রতিবেদনের সুপারিশ আলোকে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়।

গত ২২-১১-২০২০ খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, মহোদয়ের সভাপতিত্বে উক্ত প্রকল্পের উপর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে একটি যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের রাজিবপুর উপজেলার মেম্বারপাড়া অংশের অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের ১৫০০.০০ মিটার ও মোহনগঞ্জ এলাকায় ১০০০.০০ মিটার অংশের জন্য Low Cost Adaptive Design এর জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের

পরিকল্পনা-৩ শাখার স্মারক নং- ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-১৪৭, তারিখ-০১-১২-২০২০ খ্রিঃ মোতাবেক পূর্বের কমিটি পুনরায় পরিদর্শন পূর্বক মতামত প্রদানের জন্য প্রস্তাবনা গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে কমিটি পুনরায় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের প্রেক্ষিতে Low Cost Adaptive Design এর প্রতিবেদন প্রদান করেছেন। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ডিজাইন দপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত ডিজাইনের আলোকে পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হলে গত ০৩-০২-২০২১ তারিখে বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (ডিপিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আরডিপিপিতে প্রস্তাবিত অতিরিক্ত ১০০০.০০ মিটার ও পূর্বে অনুমোদিত দরপত্র আহবান না করা রাজিবপুর উপজেলার মেঘারপাড়া অংশের ১৫০০.০০ সহ মোট ২৫০০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ Adaptive Low-cost Design (Geo textile bag, Mat) বাস্তবায়ন করা যেতে পারে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ডিপিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে আরডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছিল এবং অনুমোদন হয়।

৩৩. প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌক্তিকতা (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৩.১ ধারণা

বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ, যার প্রাকৃতিক সম্পদের ভিত্তি দুর্বল, শিল্পায়নের অভাব এবং বন্যা, নদীভাঙন, লবণাক্ত জলাবদ্ধতা ও ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণতা এটিকে বিশ্বের অন্যতম অনুন্নত দেশে পরিণত করেছে। দারিদ্র্যের জন্য দায়ী প্রধান সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে বারবার বন্যার কারণে উচ্চ মাত্রার ভূমিহীনতা, নদীভাঙন (অর্থাৎ জনসংখ্যার স্থানচ্যুতি এবং উৎপাদনশীল কৃষি ও শহরে জমির সম্ভাব্য ভাঙনজনিত ক্ষতি ও ক্ষয়ক্ষতি এবং সম্পত্তি ও অবকাঠামোর মারাত্মক ক্ষতি), বেকারত্ব, নিরক্ষরতা এবং অপুষ্টি। প্রকল্প এলাকার জনসংখ্যা অত্যন্ত ঘন এবং ভূমিহীন জনসংখ্যা প্রায় ২০-৩০%। এই অঞ্চলের দারিদ্র্য দূর করার প্রধান উদ্দেশ্য হলো কৃষি ও ব্যবসা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, বন্যা নিয়ন্ত্রণ সহায়তা প্রদান এবং শহর ও গ্রামীণ এলাকার সম্ভাব্য জমি ও অবকাঠামোকে ভাঙনের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। প্রকল্পটি পরিবেশগত ক্ষিনিং ক্যাটাগরি 'বি'-তে রাখা হয়েছে, কারণ এর নদী তীর সুরক্ষা কাজ, নদী পুনঃখনন কাজ, বীধ পুনর্গঠন কাজ এবং নিয়ন্ত্রক নির্মাণ কাজ কোনো অপরিবর্তনীয় ও বিভিন্ন ধরনের প্রতিকূল ভৌত ও সামাজিক প্রভাব সৃষ্টি করে না। শনাক্তযোগ্য প্রতিকূল প্রভাবগুলো বাস্তবায়নকালীন সময়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ফলস্বরূপ, নদী তীর সুরক্ষা কাজ, নদী পুনঃখনন কাজ, বীধ পুনর্গঠন কাজ এবং নিয়ন্ত্রক নির্মাণ কাজের মাধ্যমে গৃহীত পদক্ষেপের ফলে উক্ত এলাকায় ও তার আশেপাশে খুব সামান্য বা কোনো নেতিবাচক প্রভাব পড়েনি। প্রকল্পটি প্রকল্প এলাকায় ভয়াবহ বন্যার ফলে ফসল, সম্পত্তি এবং অবকাঠামোর ক্ষতি প্রতিরোধ করবে।

৩৩.২ নকশা

বর্তমান নির্মাণ কাজের উপাদানগুলো বিডল্লিউডিবি-এর ডিজাইন সার্কেল-৬ কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুতির সময় অনুমোদিত ডিজাইন ও ড্রয়িং অনুযায়ী ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং কার্যকালীন সময়ে বিডল্লিউডিবি-এর ডিজাইন সার্কেল-৬ সর্বশেষ নদীর রূপ, অবস্থান এবং সময়ের ভিত্তিতে সমস্ত কাজের ডিজাইন পর্যালোচনা করেছে।

৩৩.৩ স্থান

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচর ঘাট পর্যন্ত এবং রাজীবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত।

৩৩.৪ বাস্তবায়নকাল

এলাকাবাসী, স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সর্বস্তরের জনগণের অব্যাহত দাবীর মুখে উক্ত এলাকাসমূহে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের জন্য বাপাউবো (সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০০২(৯ম খন্ড)/১০ তারিখঃ ১৪-০১-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিগত ১৮-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ভাঞ্জন কবলিত এলাকা পরিদর্শনপূর্বক কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী ও বলদমারা এবং রাজিবপুর উপজেলার মেঘারপাড়া হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর ভাঞ্জন হতে বিস্তীর্ণ এলাকা রক্ষার জন্য স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিপিপি প্রণয়নের জন্য সুপারিশ করেন, যা বোর্ড সচিবালয় স্মারক নং- বাপাউবো (সচি)/পরি-১/কাপ্র-২০১৬/২৫৬ তারিখঃ ১১-১২-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক দাখিলকৃত প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত সুপারিশের আলোকে “কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঞ্জন হতে বামতীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটি ০৯-০৪-২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদনের পর পরিকল্পনা কমিশনের ০৮-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখের

২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৩৬.১৯-১৬৪, নম্বর স্মারকমূলে জিও জারি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৯-০৭-০১৯ তারিখের ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-১২৩ নম্বর স্মারকমূলে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৭৯২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল ০১ এপ্রিল/২০১৯ হতে ৩০ জুন/২০২১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম সংশোধন সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৩-০৩-২০২১ তারিখের ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-২৩৭ নম্বর স্মারকমূলে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৮০৪২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১৯ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৩ দফায় বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) অনুমোদিত হয়েছে।

৩৪. প্রকল্প পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৪.১ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)

এলাকাবাসী, স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, উপজেলা চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানসহ সর্বস্তরের জনগণের অব্যাহত দাবীর মুখে উক্ত এলাকাসমূহে নদীর তীর সংরক্ষণ কাজের প্রকল্পের ডিপিপি প্রস্তুতের জন্য বাপাউবো (সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০০২(৯ম খন্ড)/১০ তারিখঃ ১৪-০১-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক একটি কারিগরি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি বিগত ১৮-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনপূর্বক কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী ও বলদমারা এবং রাজিবপুর উপজেলার মেঘারপাড়া হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর ভাঙ্গন হতে বিস্তীর্ণ এলাকা রক্ষার জন্য স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২৫.০০০ কিঃমিঃ ব্রহ্মপুত্র নদে ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিপিপি প্রনয়নের জন্য সুপারিশ করেন, যা বোর্ড সচিবালয় স্মারক নং- বাপাউবো (সচি)/পরি-১/কাপ-২০১৬/২৫৬ তারিখঃ ১১-১২-২০১৬ খ্রিঃ মোতাবেক দাখিলকৃত প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

৩৪.২ প্রকল্প সনাক্তকরণ

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচর ঘাট পর্যন্ত ৩.৫০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ এবং রাজীবপুর উপজেলা সদর মেঘারপাড়া ১.৫০০ কিঃমিঃ ও মোহনগঞ্জ বাজার ৩.৩০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পর্যন্ত। এছাড়াও চারটি স্থানে ৪টি আরসিসি ঘাটলা নির্মাণ কাজ।

৩৪.৩ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে প্রতি বছর বন্যা ও বন্যার পরবর্তী সময়ে ব্যাপক নদী ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে উক্ত এলাকার সরকারী ও বে-সরকারী বহু স্থাপনা ও ফসলী জমি নদ গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অব্যাহত নদ ভাঙ্গনের ফলে উক্ত এলাকার নিম্ন আয়ের মানুষ প্রতিনিয়ত নিঃশ্বাস হয়ে পড়েছে। যে কারনে অত্র এলাকার নদ-নদী ভাঙ্গনরোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় বাংলাদেশের মানচিত্র পরিবর্তন ঘটানোর আশংকা রয়েছে। বিগত কয়েক বছরের ব্রহ্মপুত্র নদের অব্যাহত ভাঙ্গনে রৌমারী উপজেলার ফুলুয়ার চর, কর্তিমারী, রাজীবপুর উপজেলার উপজেলা সদর ও মোহনগঞ্জ এলাকায় ব্যাপক ভাঙ্গনে প্রসিদ্ধ এবং জনগুরুত্বপূর্ণ অনেক সরকারী ও বেসরকারী স্থাপনা নদের গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে অধিক ভাঙ্গন প্রবণ এলাকার ভাঙ্গন রোধে “কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন হতে বামতীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৩৪.৪ প্রকল্পের প্রাক-মূল্যায়ন

৩৪.৫ অর্থায়ন

জিওবি অনুদান

৩৪.৬ প্রকল্প অনুমোদন

“কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন হতে বামতীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটি ০৯-০৪-২০১৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি অনুমোদনের পর পরিকল্পনা কমিশনের ০৮-০৭-২০১৯খ্রিঃ তারিখের ২০.০০.০০০০.৪১১.১৪.০৩৬.১৯-১৬৪, নম্বর স্মারকমূলে জিও জারি ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ০৯-০৭-০১৯ তারিখের ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-১২৩ নম্বর স্মারকমূলে প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৭৯২৩.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল ০১ এপ্রিল/২০১৯ হতে ৩০ জুন/২০২১ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের ১ম

সংশোধনি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ২৩-০৩-২০২১ তারিখের ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-২৩৭ নম্বর স্মারকমূলে অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৪৮০৪২.০০ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন কাল এপ্রিল/২০১৯ হতে জুন/২০২২ পর্যন্ত। প্রকল্প চলাকালীন সময়ে ৩ দফায় বিধি মোতাবেক যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ (তিন) বছর (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৫ পর্যন্ত) অনুমোদিত হয়েছে।

৩৪.৭ অন্যান্য (যদি থাকে)

৩৫. প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর অবস্থা ও প্রকল্পের ফলাফল বিশ্লেষণ (নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে):

৩৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে উপকারভোগীদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল কি না
হ্যাঁ

৩৫.২ প্রকল্প থেকে সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য কার্যক্রম
অংশীজনগণ প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাসমূহ সরাসরি ব্যবহার করছেন।

৩৫.৩ প্রকল্পের ও এন্ড এম কার্যক্রম
প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ার পর, বিডরিউডিবি-র নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) বাজেট থেকে প্রধান মেরামত ও পুনর্বাসন কাজগুলো সম্পন্ন করা হবে।

৩৫.৫ প্রকল্পের প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)

প্রত্যক্ষ

রৌমারী এবং রাজিরপুর উপজেলায় বক্ষপুত্র নদের বামতীরের ভাঞ্জনরোধে ৮.৩০০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ এবং আরসিসি ঘাটলা নির্মাণ।

পরোক্ষ

নদী ভাঞ্জন রোধের মাধ্যমে এলাকার দারিদ্র্য দূরীকরণ। সামাজিক নিরাপত্তাসহ এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন অব্যাহত রাখা। প্রকল্পের নিকটবর্তী স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি নদী ভাঞ্জন হতে রক্ষা করা।

৩৫.৬ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ব্যবস্থাঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৫.৭ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান
নির্মাণকালে বিপুল সংখ্যক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছিল।

৩৫.৮ আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতা
যেহেতু বিদ্যমান বাণিজ্যিক ও ব্যবসায়িক কেন্দ্রগুলো ভয়াবহ বন্যা, নদীভাঙন এবং পরিবেশগত অবক্ষয় থেকে সুরক্ষিত, তাই স্ব-কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে।

৩৫.৯ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের সম্ভাব্যতা
হ্যাঁ, প্রকল্প-সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকায় নারী কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩৫.১০ উন্নয়নের নারীদের অংশ গ্রহণ
হ্যাঁ।

৩৫.১১ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব

প্রকল্প এলাকাকে নদীভাঙন থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। ফলে এলাকায় আর্থ-সামাজিক ভারসাম্য উন্নত হয়।

৩৫.১২ পরিবেশের ওপর প্রভাব

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন সাধিত হয়।

৩৫.১৩ প্রকল্প টেকসইকরণ ও এক্সিট প্ল্যান

প্রকল্পটি চালু বিদ্যমান রয়েছে, তবে এর পর্যায়ক্রমিক রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন।

৩৫.১৪ দারিদ্র্য দূরীকরণ/হাসকরণে অবদান

প্রকল্পটি দারিদ্র্য বিমোচনে সরাসরি অবদান ও প্রভাব রাখে।

৩৫.১৫ জনপ্রতিনিধি, স্থায়ী অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, মহিলা প্রতিনিধি প্রমুখের মতামত প্রকল্পটি সম্পর্কে ইতিবাচক মন্তব্য পাওয়া গেছে।

৩৫.১৬ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অবদান এবং এনজিও কর্মকাণ্ডের সাথে দ্বৈততা সম্পর্কে মতামত প্রযোজ্য নয়।

৩৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা (মেয়াদ ও সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা (নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা) করা যেতে পারে:

৩৬.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.২ প্রকল্প পরিচালক: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৩ ভূমি অধিগ্রহণ: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৪ ক্রয় কার্যক্রম: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৫ পরামর্শ সেবা: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৬ ঠিকাদার: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৭ লোকবল: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৮ আইন শৃংখলা: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.৯ প্রাকৃতিক দুর্যোগ: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১০ প্রকল্পে অর্থায়ন: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১১ বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১২ নকশা প্রস্তুত ও অনুমোদন: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৩ প্রকল্প সহায়তা ছাড়করণ এবং পূর্ণভরণ: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৪ মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি:

কিছু নতুন কাজ অন্তর্ভুক্ত করা এবং তহবিলের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে অতিরিক্ত সময় লেগেছিল।

৩৬.১৫ তত্ত্বাবধান/পরিবীক্ষণ: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্ব: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৭ যানবাহন: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৮ প্রশিক্ষণ: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৯ অনুমোদন: প্রযোজ্য নয়।

৩৬.২০ অন্যান্য।


৩৭. প্রকল্প পরিচালকের মতামত এবং সুপারিশ:

ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলা ২টির অবস্থান এবং উপজেলা ২ টির স্থলভাগ গড়ে প্রায় ৫.০০ কিঃমিঃ প্রশস্ত, যার পূর্বপ্রান্তে ভারতের আসাম ও মেঘালয় রাজ্য অবস্থিত। এ কারণে উপজেলা ২ টির অবস্থান বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তাসহ সামরিক ও অর্থনৈতিকভাবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রতি বছর বন্যা ও বন্যার পরবর্তী সময়ে এ এলাকার ব্যাপক নদী ভাঙ্গন দেখা দেয়। ফলে উক্ত এলাকার সরকারী ও বেসরকারী বহু স্থাপনা ও ফসলী জমি নদ গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অব্যাহত নদ ভাঙ্গনের ফলে উক্ত এলাকার নিম্ন আয়ের মানুষ প্রতিনিয়ত নিঃশ্ব হয়ে পড়েছে। যে কারণে অত্র এলাকার নদ-নদী ভাঙ্গনরোধে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্যথায় রৌমারী ও রাজীবপুর উপজেলায় বাংলাদেশের মানচিত্র পরিবর্তন ঘটানোর আশংকা রয়েছে। ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গনরোধে বামতীরে ৮.৩০০ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ প্রায় ৪৮০৪২.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর প্রকল্প এলাকার জনগণের মধ্যে শারীরিক নিরাপত্তা ও সুরক্ষাবোধের উন্নয়ন ঘটেছে, যার ফলে আবাসন ও বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণে এবং ব্যবসা ও উন্নয়নমূলক কাজে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কৃষি ও মৎস্য সম্পদ উৎপাদন এবং জমির মূল্যের উপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে। এই সকল উপাদান কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করবে এবং দারিদ্র্য বিমোচন ঘটাবে। এই প্রকল্পের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্যের সাথে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিশেষ করে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং ভয়াবহ বন্যা ও নদীভাঙন প্রশমনের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের টিকে থাকার জন্য অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণের মতো প্রাকৃতিক উদ্দেশ্যগুলোর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে।

৫

অনুমোদিত ডিপিপি (বিনা ব্যয়ে সময় বর্ধিতকরণ) অনুযায়ী, প্রকল্পটির সূচনা ও সমাপ্তি ২০১৯-২০২০ থেকে ২০২৪-২০২৫ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়ার কথা ছিল এবং সেই অনুযায়ী প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সমস্ত উপাদান বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বিডলিউডিবি-র টাস্কফোর্স কমিটি বাস্তবায়িত কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করেছে। বাস্তবায়নকালে, আইএমইডি, এমওডব্লিউআর এবং বিডলিউডিবি-র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা প্রকল্পটি পরিদর্শন করেছেন এবং তাদের পর্যবেক্ষণ ও সুপারিশগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এখন প্রকল্পটি সমাপ্তির পর, অধিকতর স্থায়ীত্বের জন্য বাস্তবায়িত রিভেটমেন্ট কাজগুলোর যথাযথ পর্যবেক্ষণ এবং নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন। প্রকল্পটি বিশেষভাবে এসডিজি (লক্ষ্য ১, ২, ৬, ১১ এবং ১২)-এর সাথে সংযুক্ত। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পানি খাতের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত রয়েছে। এটি ভূমি ভাঙ্গন প্রতিরোধ কার্যক্রম অব্যাহত রাখবে। দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে এমন আরও অন্যান্য বাংলাদেশ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। এই প্রকল্পটি এ ধরনের অন্যান্য কৌশলগত লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত।


০৫-০৫-২০


২০.০৫.২০


তারিখ:.....

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

(মোঃ আহসান হাবীব)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-১
বাপাউবো, রংপুর।

৩৮. সংস্থা প্রধানের মতামত এবং সুপারিশ:

প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানকে ভয়াবহ নদীভাঙন থেকে রক্ষা করা। ভয়াবহ নদীভাঙন থেকে সরকারি ও বেসরকারি পরিকাঠামো, কৃষি ও অকৃষি জমি ইত্যাদি রক্ষা করার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর বরাবর নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছিল। বাস্তবায়িত প্রকল্প নদী ভাঙন থেকে রক্ষা করে স্থানীয় জনগণকে গৃহহীন হওয়া থেকে সুরক্ষাও প্রদান করে। সুতরাং, এই প্রকল্পটি তার উদ্দেশ্য সাধনে সফল বলে গণ্য করা যেতে পারে।


১৪.০৫.২০২৩

তারিখ:.....

সংস্থা প্রধানের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল
(মোঃ এনায়েত উল্লাহ)
পরিচিতি নং-৬৭০৭০৫০০১
মহাপরিচালক
বাপাউবো, ঢাকা।

৩৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের মতামত এবং সুপারিশ:

প্রকল্পটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা উচিত।

তারিখ:.....

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের স্বাক্ষর ও সীল

সংযুক্তি-ক

পণ্য ক্রয় সংক্রান্তঃ

প্রকল্প শীর্ষক অনুযায়ী প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র প্রাপ্ততার তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করণের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিস্থান ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তির তারিখ	
												চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
জি-১	ডাবল কেবিন সিকভার্স	প্রকল্পনা: ৫৫.০০	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি										
		প্রকৃত:	সরাসরি ক্রয় পদ্ধতি										
		ব্যয়:	-	-	-								
জি-২	স্পিড বোট (ইঞ্জিন ও আনুষঙ্গিকসহ)	প্রকল্পনা: ২৪.৮৯	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	EE	১৬-০১-২০২০	The Daily amar Barta &							
		প্রকৃত:	উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি	EE	১৬-০১-২০২০	The Daily Bangladesh Today							
		ব্যয়:	-	-	-								
জি-৩	মোটর সাইকেল	প্রকল্পনা: ৩.০০	আর.এক.কিউ	PD	১২-০১-২০২০		১২-০১-২০২০	২০-০১-২০২০	১১-০১-২০২০	২৪.৮৯ ও ০৯-০৩-২০২০	৩.০০	২৪-০৬-২০২০	২৪-০৬-২০২০
		প্রকৃত:	আর.এক.কিউ	PD	১২-০১-২০২০		১২-০১-২০২০	১২-০১-২০২০	১১-০১-২০২০	৩.০০ ও ০৯-০৩-২০২০	৩.০০	২৪-০৬-২০২০	২৪-০৬-২০২০
		ব্যয়:	-	-	-								

f

প্রশ্নের মূল্যায়ন		পাঠ্যক্রমের বর্ণনা												
পাঠ্যক্রম নং	পাঠ্যক্রমের বর্ণনা													
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	সমাপ্তির তারিখ		
কৃষি/ব্রহ্ম/ভন ন-০১	ভনন প্রোগ্রাম/বিশেষজ্ঞ (নিবন্ধিত) প্রকৌশলী, উপ-নিবন্ধিত প্রকৌশলী ও শ্রম কর্মচারীর প্রাথমিক (৫ টি)।	পারিকল্পনা: ২০.০০ প্রকৃত: ২০.০০ ব্যয়: ২০.০০	ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি)	EE EE EE	১৬.০১.২০২০ ১৬.০১.২০২০ ১৬.০১.২০২০	The Daily amar Bara & the Daily Bangladesh Today	০৪.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০	১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০	১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০	১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০	১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০	১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০	১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০ ১১.০২.২০২০	
কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র/০১	কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র উপ-প্রোগ্রাম/নিবন্ধিত প্রকৌশলী, উপ-নিবন্ধিত প্রকৌশলী ও শ্রম কর্মচারীর প্রাথমিক (৫ টি)।	পারিকল্পনা: ২০.০০ প্রকৃত: ২০.০০ ব্যয়: ২০.০০	ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি)	DG DG DG	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	The Daily Jamsanbar & The Daily Dhaka Tribune	২০.১১.২০১৯ ২০.১১.২০১৯ ২০.১১.২০১৯	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	
কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র/০২	কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র উপ-প্রোগ্রাম/নিবন্ধিত প্রকৌশলী, উপ-নিবন্ধিত প্রকৌশলী ও শ্রম কর্মচারীর প্রাথমিক (৫ টি)।	পারিকল্পনা: ২০.০১.২১ প্রকৃত: ২০.০১.২১ ব্যয়: ২০.০১.২১	ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি)	DG DG DG	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	The Daily Samakal & The Daily Dhaka Tribune	২০.০১.২০২০ ২০.০১.২০২০ ২০.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	
কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র/০৩	কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র উপ-প্রোগ্রাম/নিবন্ধিত প্রকৌশলী, উপ-নিবন্ধিত প্রকৌশলী ও শ্রম কর্মচারীর প্রাথমিক (৫ টি)।	পারিকল্পনা: ২০.০১.২১ প্রকৃত: ২০.০১.২১ ব্যয়: ২০.০১.২১	ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি)	CCGP CCGP CCGP	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	The Daily amader Naim Somoy & The Daily Independent	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	
কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র/০৪	কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র উপ-প্রোগ্রাম/নিবন্ধিত প্রকৌশলী, উপ-নিবন্ধিত প্রকৌশলী ও শ্রম কর্মচারীর প্রাথমিক (৫ টি)।	পারিকল্পনা: ২০.০১.২১ প্রকৃত: ২০.০১.২১ ব্যয়: ২০.০১.২১	ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি)	ADG ADG ADG	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	The Vorer Kagoi, Dhaka Tribune & Kurigram Khabor	২০.১১.২০১৯ ২০.১১.২০১৯ ২০.১১.২০১৯	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	
কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র/০৫	কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র উপ-প্রোগ্রাম/নিবন্ধিত প্রকৌশলী, উপ-নিবন্ধিত প্রকৌশলী ও শ্রম কর্মচারীর প্রাথমিক (৫ টি)।	পারিকল্পনা: ২০.০১.২১ প্রকৃত: ২০.০১.২১ ব্যয়: ২০.০১.২১	ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি)	CE CE CE	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	The Vorer Kagoi, Dhaka Tribune, Kurigram Khabor	২০.০১.২০২০ ২০.০১.২০২০ ২০.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	
কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র/০৬	কৃষি/এটিপি/রাষ্ট্রপুত্র উপ-প্রোগ্রাম/নিবন্ধিত প্রকৌশলী, উপ-নিবন্ধিত প্রকৌশলী ও শ্রম কর্মচারীর প্রাথমিক (৫ টি)।	পারিকল্পনা: ২০.০১.২১ প্রকৃত: ২০.০১.২১ ব্যয়: ২০.০১.২১	ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি) ভবিষ্যৎ (কোয়ালিটি)	DG DG DG	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	The Daily Samakal & The Daily Dhaka Tribune	২০.০১.২০২০ ২০.০১.২০২০ ২০.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০ ১১.০১.২০২০	

[illegible]

প্যাকেজ নং	প্রকল্প নথি অনুযায়ী		প্রাথমিক স্থান (সংকট স্থান)	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	ক্রম অনুমোদনকারী	সংশোধন তারিখ	সংশোধন প্রকল্পের নাম	সংশোধন তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুদ্রিত ও প্রকৃত	প্রকৃত স্থান	মুদ্রিত ও প্রকৃত
	প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা										
(১)	কুড়ি/এডিসি/রাজিবপুর /২৪	(২) এলাকায় প্রকল্পের নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ৪০.১০০ হতে কিঃমিঃ ৪০.৩০০ পর্যন্ত ২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	(৩) প্রকৃত: ৬৪৯.৮৪ ব্যতীত:	(৪) ভটিং (একটি)	(৫) PD	(৬) ২১.০৪.২০২১	(৭) Dhaka Tribune & Kurigram Khabor	(৮) ২০.০৫.২০২১	(৯) ০৭.০৭.২০২১	(১০) ২০.০৭.২০২১	(১১) ৫৮৪.৮৬	(১২) ২০.০৭.২০২১
			পরিমাপনা: ৬৪৮.০৮ প্রকৃত: ৬৪৯.৮৪ ব্যতীত:	ভটিং (একটি)	PD	২১.০৪.২০২১	The Yorer Kagoj, Dhaka Tribune & Kurigram Khabor	২০.০৫.২০২১	০৭.০৭.২০২১	২০.০৭.২০২১	২০.০৭.২০২১	২০.০৭.২০২১
(২)	কুড়ি/এডিসি/রাজিবপুর /২৫	(২) কুড়িয়ায় প্রকল্পের নদীর বামতীর বরাবর কিঃমিঃ ৪০.৩০০ হতে কিঃমিঃ ৪০.৫০০ পর্যন্ত ২০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	প্রকৃত: ৬৪৯.৮৪ ব্যতীত:	ভটিং (একটি)	PD	২১.০৪.২০২১		২০.০৫.২০২১	০৭.০৭.২০২১	২০.০৭.২০২১	২০.০৭.২০২১	২০.০৭.২০২১
			পরিমাপনা: ৬৪৮.০৮ প্রকৃত: ৬৪৯.৮৪ ব্যতীত:	ভটিং (একটি)	PD	২১.০৪.২০২১		২০.০৫.২০২১	০৭.০৭.২০২১	২০.০৭.২০২১	২০.০৭.২০২১	২০.০৭.২০২১

R

সংযুক্তি-গ

সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ

প্রকল্প নং	প্রকল্পের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (বঙ্গ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদন কারী	দরপত্র আবেদনের তারিখ	সরবাসপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তিপ্রাপ্ত ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তির তারিখ	
												মুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
	প্রায়োজ্য নয়												

৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

“কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও
রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেশ্বারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত
ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন হতে বামতীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক

প্রকল্পের

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন।

সূচিপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিষয়	পৃষ্ঠা
	প্রথম অধ্যায়	
	প্রকল্পের বিবরণ:	
১.০	প্রকল্পের পটভূমি	১
১.১	প্রকল্প সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যাবলি	২
১.২	প্রকল্পের স্থিরচিত্র গুণগল আর্থ হতে	২-৩
১.৩	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	৪
১.৪	প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৪
১.৫	প্রকল্পের মূল কাজের অগ্রগতির বিবরণ	৪
১.৬	অনুমোদিত ডিপিপি অনুসারে বছর ভিত্তিক বরাদ্দ ও প্রকৃত ব্যয়	৪
১.৭	প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি	৪
১.৮	প্রকল্পের অঙ্গসমূহের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি	৫
১.৯	স্টিয়ারিং ও পিআইসি সংক্রান্ত	৬
	দ্বিতীয় অধ্যায়	
	মধ্যবর্তী মূল্যায়ন:	
২.০	কমিটি গঠনের পটভূমি	৭
২.১	কমিটির কর্মপরিধি	৭
২.২	মূল্যায়নের পদ্ধতি	৭-৮
২.৩	মূল্যায়ন সীমাবদ্ধতা	৮
২.৪	মূল্যায়ন কমিটির সভা	৮
	তৃতীয় অধ্যায়	
	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন:	
৩.১	ভূমিকা	৯
৩.২	প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের বিবরণ	৯-১০
	চতুর্থ অধ্যায়	
৪.০	পরিদর্শনকালীন স্থিরচিত্র সমূহ	১১-১২
	পঞ্চম অধ্যায়	
	জনপ্রতিনিধি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মতামত:	
৫.০	জনপ্রতিনিধিদের মতামত	১৩
৫.১	প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত	১৩
	ষষ্ঠ অধ্যায়	
	উপকারভোগীদের মতামত:	
৬.০	উপকারভোগীদের মতামত	১৪
	সপ্তম অধ্যায়	
৭.০	প্যাকেজ ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ	১৫-১৭
৭.১	রাস্তা নির্মাণ, প্লেসিং ও ডাম্পিং সংক্রান্ত তথ্য	১৭
৭.২	জিও ব্যাগ প্রস্তুত ও ডাম্পিং সংক্রান্ত তথ্য	১৭
৭.৩	কমিটির পর্যবেক্ষণ	১৭-১৮
৭.৪	প্রকল্প সংশোধনের কারণ	১৮
	অষ্টম অধ্যায়	
৮.০	কমিটির সুপারিশ	১৯
	সংযুক্তি	

প্রথম অধ্যায় প্রকল্পের বিবরণ

১.০। প্রকল্পের পটভূমি:

কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রতি বছরই ব্রহ্মপুত্র নদের ব্যাপক মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন হয়। বাংলাদেশ নদী মাতৃক দেশ হওয়ায় এর আর্থসামাজিক অবস্থার উপর নদীর প্রভাব অপরিসীম। অন্যদিকে ভারত দেশ হওয়ায় নদীগুলির বছরব্যাপী পানি প্রবাহও নিয়ন্ত্রনে থাকে না। ফলশ্রুতিতে বর্ষাকালের অতিরিক্ত পানি প্রবাহ এবং শুষ্ক মৌসুমে পানির অপ্রতুলতা নদী ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ফলাফল নদী ভাঙ্গন ও নদীর নাব্যতা হ্রাস। যা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী, রাজীবপুর উপজেলাদ্বয় ও উলিপুর উপজেলার সাহেবের আলগা ইউনিয়ন অবস্থিত হওয়ায় ব্রহ্মপুত্র নদের তীব্র ভাঙ্গনের শিকার হয়। বিগত কয়েক বছরের প্রবল বন্যায় ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে নদটির ব্যাপক Morphological পরিবর্তন এর ফলে বামতীরে ব্যাপক ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া এই নদটি বিনুনি প্রকৃতির হওয়ায় এর মাঝে অসংখ্য চর/ভূবোচর এর সৃষ্টি হয়। ঐ এলাকার জনগণের জীবনযাত্রা, সরকারি ও বেসরকারি স্থাপনাসমূহ ব্রহ্মপুত্র নদের ভয়াবহ ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে ১৪-০১-২০১৬ তারিখে কারিগরি কমিটি গঠিত হয়। কারিগরি কমিটি ১৮-০২-২০১৬ তারিখে ভাঙ্গন কবলিত এলাকা পরিদর্শনপূর্বক কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী ও বলদমারা এবং রাজীবপুর উপজেলার মেঘারপাড়া হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরের ভাঙ্গন হতে বিস্তীর্ণ এলাকা রক্ষার জন্য স্থায়ী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্প গ্রহণের জন্য সুপারিশ করেন। পরবর্তীতে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নপূর্বক পরিকল্পনা কমিশন থেকে ০৯-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের কাজ সূত্বে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রংপুর পওর সার্কেল-১ এর রোট সিডিউল ২০১৮-২০১৯ অনুযায়ী প্রথম দফায় নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ডিপিপি ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে ১৯টি প্যাকেজের মধ্যে ১৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়। ডিপিপিতে ২০১৭-১৮ সালের রোট সিডিউলের দর অনুসৃত হয়েছিল। ইতোমধ্যে বাপাউবোর রোট সিডিউল দুই বার পরিবর্তিত হয়। ফলে ১৯টি প্যাকেজের মধ্যে ১৫টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয় যার ব্যয় প্রায় ৪০৯৬০.৫৩ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট অর্থ প্রায় ৬৫৩১.৭১ লক্ষ টাকার মাধ্যমে বাকি ৪টি প্যাকেজের মধ্যে উজানের ৫০০ মিটারের ১টি প্যাকেজের ও ভারতের এন্টারমিনেশনের ১টি প্যাকেজের (মোট ২টি প্যাকেজের) ক্ষেত্রে সমন্বয় করা গেলেও বাকি ২টি প্যাকেজের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়।

উল্লেখ্য, বিষয়োক্ত প্রকল্পের উপর গত ০৬-০১-২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ও বাস্তবায়নের সমস্যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উক্ত সভায় মোহনগঞ্জের ভারতের ভাঙ্গন কবলিত ১০০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ বিষয়ে আলোচনা করা হলে বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে উক্ত স্থান নির্ধারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(Handwritten signatures and marks)



Google Earth

© 2020 Google

Ulipur

Image © 2021 CNES / Airbus

US Dept of State Geographer

Map © 2021 Maxar Technologies

Handwritten notes and signatures on the right margin.

১.৩। প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

১.৮। প্রকল্পের অংশসমূহের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি (৩১ ডিসেম্বর, ২০২১ পর্যন্ত):

(লক্ষ টাকা)

ক্রঃ নং	কাজের বিবরণ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী		ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	
		পরিমাণ	ব্যয় *	বাস্তব %	আর্থিক %
১	২	৩	৪	৫	৬
(ক)	রাজস্বঃ				
	সরবরাহ সেবাঃ-				
১।	সম্মানি ভাতা/ফি/ পারিশ্রমিক (বিভিন্ন কমিটির জন্য)	১ দফা	১০.০০	৬০.০০%	৬.০০
২।	সম্মানি ভাতা/ফি/ পারিশ্রমিক (মধ্যবর্তী মূল্যায়ন বাবদ)	১ দফা	৮.০০	-	-
৩।	শ্রমিক পারিশ্রমিক	১ দফা	১০.০০	৬৪.০০%	৬.৩৭
৪।	প্রচার ও বিজ্ঞাপন	১ দফা	৩.০০	৮৩.৩৩%	২.৪৯
৫।	সেমিনার, কনফারেন্স	১ দফা	৪.০০	৮০.০০%	৩.০০
৬।	বৈদেশিক প্রশিক্ষণ (অভিজ্ঞতা শেয়ারের লক্ষ্যে বৈদেশিক সফর)	১ দফা	১৩০.০০	১.৯৪%	০.০০
৭।	গ্যাস ও জ্বালানী	১ দফা	৬.০০	০.০০%	০.০০
৮।	পেট্রোল ও লুব্রিকেন্ট	১ দফা	১০.০০	৮০.০০%	৭.০০
৯।	অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	১ দফা	১০.০০	৬০.০০%	৫.০০
১০।	টেশনারি, সিল ও স্ট্যাম্প	১ দফা	৮.০০	৬০.০০%	৪.০০
১১।	সার্ভে অনুসন্ধান	১ দফা	১০.০০	৭০.০০%	৬.০০
	মেরামত ও সংরক্ষণ				
১২।	যানবাহন (জিপ ৩টি এবং মোটরসাইকেল ৬টি)	১ দফা	৩.০০	১০০.০০%	৩.০০
১৩।	ভবন মেরামত/রিনোভেশন	১ দফা	২০.০০	১০০.০%	১৮.০০
	উপ-মোট রাজস্ব =		২৩২.০০	৩০.৮৭% (০.২৩৫)	৬০.৮৬
(খ)	মূলধনঃ-				
১৪।	নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ (৮.৩০ কিঃমিঃ)	৮.৩০ কিঃমিঃ	৪৭৬১১.১১	৩২.৮০%	১৩৯৭২.৬৬
১৫।	আর.সি.সি ঘাটলা নির্মাণ (৪ টি লোকেশনে)	৪ টি	১৬.০০	০.০০	০.০০
১৬।	মোটরযান -মোটর সাইকেল (১৫০সিসি)	২টি	৩.০০	১০০.০০%	৩.০০
১৭।	মোটরযান (ডাবল কেবিন পিক-আপ)	১টি	৫৫.০০	০.০০%	০.০০
১৮।	জলযান (স্পিড বোট, ইঞ্জিন ও আনুসঙ্গিকসহ)	১টি	২৪.৮৯	১০০.০০%	২৪.৮৯
	উপমোট মূলধন ব্যয় =		৪৭৭১০.০০	৩২.৯৫%	১৪০০০.৫৫
	মোট ব্যয় (ক+খ)		৪৭৯৪২.০০	২৩.৭৯%	১৪০৬১.৪১
	(ফিজিক্যাল+গ্রাইস কন্ট্রোল) থোক =		১০০.০০	-	-
	সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় (ক+খ) =		৪৮০৪২.০০	৩২.৭৩%	১৪০৬১.৪১ (২৯.২৭%)

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large '25' and several checkmarks.

১.৯। সিঙ্গারিং ও পিআইসি সংক্রান্ত:

প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রতি ৩ (তিন) মাস অন্তর এবং জরুরি প্রয়োজনে যেকোন সময়ে সিঙ্গারিং/ পিআইসি সভা করা যেতে পারে। গত ১২/০৯/২০২১ তারিখে উক্ত প্রকল্পের ৪র্থ সিঙ্গারিং কমিটির সভা এবং ০১/১২/২০২১ তারিখে একটি পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সর্বশেষ সিঙ্গারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

আলোচ্য বিষয়	সভার সিদ্ধান্ত	গৃহীত ব্যবস্থা
সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক সভায় জানান যে, প্রকল্পের নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ২৪টি প্যাকেজের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভায় প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি কম হওয়ার কারণ জানতে চাওয়া হলে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্রকল্পটি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকায়। প্রকল্প এলাকায় মালামাল ও যন্ত্রপাতি পরিবহন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সভায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণ এবং বাস্তবতার আলোকে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা যেতে পারে মর্মে একমত পোষণ করা হয়। প্রকল্প পরিচালক সভায় আরও জানান যে, প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থবছরের আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। সভায় বাস্তবতার আলোকে আরএডিপি বরাদ্দ প্রদান করা যেতে পারে মর্মে আলোচনা হয়।	ক) প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে; (খ) বাস্তবতার আলোকে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির সুপারিশ করা হলো; (গ) প্রকল্পটির অনুকূলে বাস্তবতার আলোকে আরএডিপিতে বরাদ্দ প্রদানের সুপারিশ করা হলো।	প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব জানুয়ারি ২২ এর মধ্যে বোর্ডে প্রেরণ করা হবে।

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

দ্বিতীয় অধ্যায় মধ্যবর্তী মূল্যায়ন

২.০ কমিটি গঠনের পটভূমিঃ

প্রকল্পের সকল কাজ যথাসময়ে সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রকল্পের ডিপিপি'তে মধ্যবর্তী মূল্যায়নের সংস্থান রয়েছে। ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী উক্ত মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘনাগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ডাকান হতে বামতীর সংরক্ষণ (১ সংশোধিত))", শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৬.১৭-১৪৮ তারিখ: ২২/১১/২০২১ অনুযায়ী নিম্নরূপ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়:

ক্র.	কমিটির সদস্য/প্রতিনিধি	কমিটিতে অবস্থান
০১।	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।	উপদেষ্টা
০২।	যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা উইং, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।	আহ্বায়ক
০৩।	যুগ্মপ্রধান (পানি সম্পদ), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।	যুগ্ম আহ্বায়ক
০৪।	যুগ্মসচিব, উন্নয়ন-১, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
০৫।	আইএমইডি'র কৃষি, পল্লী উন্নয়ন ও গবেষণা সেক্টরের একজন প্রতিনিধি।	সদস্য
০৬।	যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
০৭।	উপসচিব, (উন্নয়ন-২ অধিশাখা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।	সদস্য
০৮।	উপপ্রধান, (পানি সম্পদ), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন।	সদস্য
০৯।	প্রধান পরিকল্পনা/ চীফ মনিটরিং দপ্তরের একজন প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।	সদস্য
১০।	প্রকল্প পরিচালক/ নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুড়িগ্রাম।	সদস্য
১১।	সংশ্লিষ্ট ডেস্ক অফিসার, পরিকল্পনা কমিশনের সেচ উইং।	সদস্য
১২।	পরিকল্পনা অনুবিভাগের সংশ্লিষ্ট ডেস্ক কর্মকর্তা (উপসচিব-৩), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।	সদস্য সচিব

২.১ কমিটির কর্মপরিধি:

- ০১। কমিটি সময়ে সময়ে প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অগ্রগতি ও গুণগতমান যাচাই করবে;
- ০২। কমিটি প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও ফলাফল বিষয়ে সুফলভোগীদের সাথে আলোচনা করবে এবং বাস্তবায়ন সমস্যাদি চিহ্নিতকরণ করবে;
- ০৩। কমিটি প্রকল্পের বাস্তবায়নসহ অন্যান্য প্রাসংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান করবে; এবং
- ০৪। কমিটি প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণপূর্বক সুপারিশসহ এ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মহোদয়ের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করবে।

২.২ মূল্যায়ন পদ্ধতিঃ

মধ্যবর্তী মূল্যায়নে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছেঃ

- মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সর্বপ্রথম প্রকল্প দলিল, এডিপি/আরএডিপি এবং প্রকল্পের বিভিন্ন অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়ে আলোচনা ও পর্যালোচনা করা;
- কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রকল্পের কাজের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন এবং প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কাজের তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করা;
- কমিটির সদস্যবৃন্দ কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে প্রকল্পের উপকারভোগী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা ও মতামত গ্রহণ;

(Handwritten signatures and marks)


- মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির পরিদর্শনলব্ধ অভিজ্ঞতা, মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, উপকারভোগী এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামত ও সংশ্লিষ্ট বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর প্রকল্প কর্তৃপক্ষের নিকট রক্ষিত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২.৩। মূল্যায়নের সীমাবদ্ধতাঃ

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের বিষয়ে উল্লেখ থাকলেও কোভিড পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র একবার প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া সময়ের স্বল্পতার কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়নাধীন সম্পূর্ণ ৮.৩০ কিমি এলাকা পরিদর্শন করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্পের দলিলাদি পর্যালোচনা, প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, স্থানীয় জনগণ, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, প্রকল্পের অংশীদার ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাপূর্বক তাদের মতামত নেয়া হয়েছে এবং এ সকল বিষয় বিবেচনায় নিয়ে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.৪। মূল্যায়ন কমিটির সভা:

গত ২৮/১১/২০২১ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ রোকন উদ-দৌলা এর সভাপতিত্বে কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় একটি বাস্তবসম্মত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কো অপ্ট করা, প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করা, প্রকল্পের অগ্রগতি, স্থানীয় উপকারভোগীদের সাথে মতবিনিময়, প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্য যাচাই বাছাই, খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গত ১০/১২/২০২১ তারিখে ২য় ও ১১/১২/২০২১ ৩য় সভা অনুষ্ঠিত হয়।



তৃতীয় অধ্যায় প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন

৩.০ ভূমিকা:

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি গত ১০/১২/২০২১ তারিখ হতে ১১/১২/২০২১ তারিখ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রকল্পের উপকারভোগী, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন, তাদের মতামত নেন এবং বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেন।


৩.১ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের বিবরণ:

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্প এলাকাভুক্ত কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে ঘুঘুমারী, বলদমারা ও ফুলুয়ারচর ঘাট এলাকায় বাস্তবায়নাধীন নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জানা যায়, উক্ত এলাকায় ৯টি প্যাকেজে ইজিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বান করে নির্বাচিত ঠিকাদারদের মাধ্যমে ৩.৫০০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে।

➤ পরিদর্শনকালে কমিটির সদস্যরা কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-১৮ প্যাকেজটি পরিদর্শন করেন। প্যাকেজটি স্ট্যান্ডার্ড-সাসি(জেভি), তাহের টাওয়ার (১২তলা), গুলশান, ঢাকা-১২১২ নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্যাকেজের অনুকূলে মোট সি.সি ব্লকের সংখ্যা ২৯৭৯৪৯ টি। তন্মধ্যে ১৭৩৮৫৮ টি সিসি ব্লক তৈরি হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে দেখা যায়। কংক্রিট ব্লক ঢালাই এর জন্য তৈরীকৃত প্ল্যাটফর্মটি অসমান ও এবরো-থেবরো, তাই যে সকল কংক্রিট ব্লক নির্মাণ হচ্ছে তা মানসম্মত হচ্ছে না এবং নির্মিত ব্লকের ফিনিশিং ভাল না। কংক্রিট ব্লক ঢালাই হার ১:২.৫:৫.৫। সাইটে আনোয়ার সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু উক্ত সিমেন্টের টেস্ট রিপোর্ট সাইটে নেই। স্টোন চিপস ৪০মি.মি. সাইজের হওয়ার কথা থাকলেও কিছু কিছু স্টোন চিপস বড় সাইজের দেখা যায়। বালির Fineness Modulus ১.৫ হওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও ব্যবহৃত বালির ক্ষেত্রে তা’ কম বলে প্রতীয়মান হয়। বালির টেস্ট রিপোর্টও সাইটে নেই। পাশাপাশি ২৫০ কেজি ওজনের জিও ব্যাগের সংখ্যা ৯০১৪৪টি। যার মধ্যে ৮১৯০৩ টি জিও ব্যাগের ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, জুন ২০২২ এর মধ্যে প্যাকেজটির কাজ সম্পন্ন হবে। প্যাকেজটি সার্বিক অগ্রগতি ৫৮.৭৬%।

➤ অতঃপর কমিটির সদস্যরা কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-১৭ প্যাকেজটি পরিদর্শন করেন। প্যাকেজটি মেসার্স ডন করপোরেশন এন্ড সান ফ্লাউয়ার জেভি, রামপুরা, ঢাকা, নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সাইটে প্রিমিয়ার সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু উক্ত সিমেন্টের টেস্ট রিপোর্ট সাইটে নেই। সাইটে স্টোন চিপস এর স্বল্পতা রয়েছে। বালির Fineness Modulus ১.৫ হওয়া বাঞ্ছনীয় হলেও ব্যবহৃত বালির ক্ষেত্রে তা’ কম বলে প্রতীয়মান হয়। পরিদর্শনকালে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে তিনি জানান, জুন ২০২২ এর মধ্যে প্যাকেজটির কাজ সম্পন্ন হবে। প্যাকেজটি সার্বিক অগ্রগতি ২২%।

➤ পরবর্তীতে কমিটির সদস্যরা কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-০৯ প্যাকেজটি পরিদর্শন করেন। প্যাকেজটি আরবিএল- আরপিএল (জেভি), মধ্য বাজা, ঢাকা নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্যাকেজের অনুকূলে মোট সি.সি ব্লকের সংখ্যা ২৯৭৯৪৯টি। তন্মধ্যে ১১৫০০০টি সিসি ব্লক তৈরি হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে দেখা যায়। পাশাপাশি ২৫০ কেজি ওজনের জিও ব্যাগের সংখ্যা ৯০১৪৪টি। যার মধ্যে ৫০৫০০ টি জিও ব্যাগের ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে সাইটে ৩টি Mixture Machine দৃষ্ট হয়।





- অতঃপর কমিটির সদস্যরা কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-৬ প্যাকেজটি পরিদর্শন করেন। প্যাকেজটি ওরিয়েন্ট ট্রেডিং এন্ড বিল্ডার্স লিঃ এন্ড আরএফএল প্রাস্টিক লিঃ (জেভি) নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্যাকেজের অনুকূলে মোট সি.সি ব্লকের সংখ্যা ২২৫০০০টি। তন্মধ্যে ৭৩০০০টি সিসি ব্লক তৈরি হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে দেখা যায়। এখন অবশিষ্ট রয়েছে ১,৫২,০০০টি ব্লক। সাইটে ফ্রেশ সিমেন্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু উক্ত সিমেন্টের স্টক রিপোর্ট সাইটে নেই। সাইটে প্রয়োজনীয় স্টোন চিপস এর স্বল্পতা রয়েছে। প্যাকেজটি সার্বিক অগ্রগতি ৩১%।
- কমিটির সদস্যরা কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-০৭ প্যাকেজটি পরিদর্শন করেন। প্যাকেজটি আরবিএল-পিডিএল (জেভি), ১০৫ মেরুল বাড্ডা, ঢাকা নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত প্যাকেজের অনুকূলে মোট সি.সি ব্লকের সংখ্যা ২৯৭৯৪৯টি। তন্মধ্যে ৮০০০০টি সিসি তৈরি হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে দেখা যায়, এখন অবশিষ্ট রয়েছে ২২০০০০টি ব্লক। কংক্রিট ব্লক ঢালাই হার ১:৩:৫.৫। প্যাকেজটিতে ২টি Mixture Machine চালু ছিল। কিন্তু এই হারে ব্লক তৈরি হলে প্যাকেজটি সময়মত শেষ হবে না, তাই Mixture Machine এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। এছাড়া ২৫০ কেজি ওজনের জিও ব্যাগের সংখ্যা ৯০১৪৪টি। যার মধ্যে ২২৯২০টি জিও ব্যাগের ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। পরিদর্শনকালে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিকে কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি জানান এপ্রিল ২০২২ এর মধ্যে জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর কাজ সম্পন্ন হবে। প্যাকেজটি সার্বিক অগ্রগতি ২৫%। কমিটি দ্রুত কাজ বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।
- অতঃপর কমিটির সদস্যরা বাস্তবায়িত নদীতীর সংরক্ষণ কাজের কুড়ি/এডিপি/রৌমারী/পি-১৬ প্যাকেজটি পরিদর্শন করেন। প্যাকেজটি এম এম বিল্ডার্স এন্ড ইন্জিনিয়ার্স লিঃ-শেখ ইমদাদুল হক আল মামুন (জেভি), রোজিনা কটেজ, বড়গাছা, নাটোর নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্যাকেজের অনুকূলে মোট সি.সি ব্লকের সংখ্যা ২৯৭৯৪৯টি। তন্মধ্যে ১০৫২৪৮টি সিসি তৈরি হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে দেখা যায়। পাশাপাশি ২৫০ কেজি ওজনের জিও ব্যাগের সংখ্যা ৯০১৪৪টি। যার মধ্যে ৫২২৭৮টি জিও ব্যাগের ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্যাকেজের পর্যাপ্ত ম্যাটেরিয়াল মজুদ রয়েছে। প্যাকেজটি সার্বিক অগ্রগতি ৩৮.৬০%।
- পরবর্তীতে কমিটির সদস্যরা প্রকল্প এলাকাভুক্ত কুড়িগ্রাম জেলার রাজিবপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে মোহনগঞ্জ নামক স্থানে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে জানা যায়, উক্ত এলাকায় ১১টি প্যাকেজে ইজিপিতে উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নির্বাচিত ঠিকাদার কর্তৃক ৩.৩০ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। তার মধ্যে রাজিবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ এলাকায় কুড়ি/এডিপি/রাজিবপুর/পি-২১ হতে কুড়ি/এডিপি/রাজিবপুর/পি-২৫ এর মাধ্যমে মোট ৫টি প্যাকেজে ১০০০.০০ মিটার চলমান নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে উক্ত স্থানে স্লোপ তৈরির কাজ চলমান রয়েছে, পাশাপাশি জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ চলমান রয়েছে। উক্ত এলাকায় ১১টি প্যাকেজের মধ্যে উজানের ৬টি প্যাকেজে ২৩০০ মিটার সি.সি ব্লকের মাধ্যমে এবং অবশিষ্ট ৫টি প্যাকেজে ১০০০ মিটার অংশের কাজ স্যান্ড-সিমেন্ট জিও ব্যাগ স্পেসিং ও জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে।
- সর্বশেষে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক রাজিবপুর উপজেলার নদীতীর সংরক্ষণ কাজের কুড়ি/এডিপি/রাজিবপুর/পি-১০ ও ১১ নম্বর প্যাকেজের কাজ পরিদর্শন করা হয়। প্যাকেজটি মেসার্স সালেহ আহমদ এন্ড মেসার্স বেলাল কনস্ট্রাকশন, (জেভি) দাদা মোড়, লোহাপাট্টা, কুড়িগ্রাম নামক ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উক্ত প্যাকেজের অনুকূলে মোট সি.সি ব্লকের সংখ্যা ৩০২০৩০টি। তন্মধ্যে ১১৪৬০৩টি সি.সি ব্লক তৈরি হয়েছে মর্মে পরিদর্শনে জানা যায়। পাশাপাশি ২৫০ কেজি ওজনের জিও ব্যাগের সংখ্যা ৯০১৪৪টি। যার মধ্যে ৭১৬৪২টি জিও ব্যাগের ডাম্পিং সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে উক্ত প্যাকেজের সাইটে স্টোন চিপসের পর্যাপ্ত মজুদ নেই। প্যাকেজটি সার্বিক অগ্রগতি ৪১.৯০%।

(Handwritten signatures and marks)

চতুর্থ অধ্যায়




৪.০। পরিদর্শনকারীরা স্থিরচিত্রসমূহ:

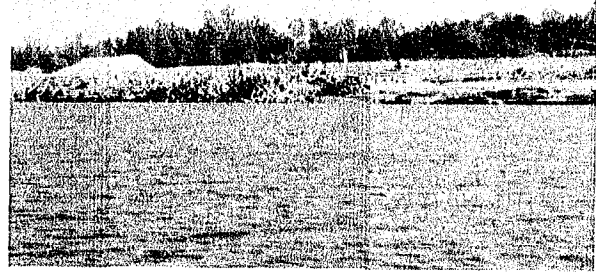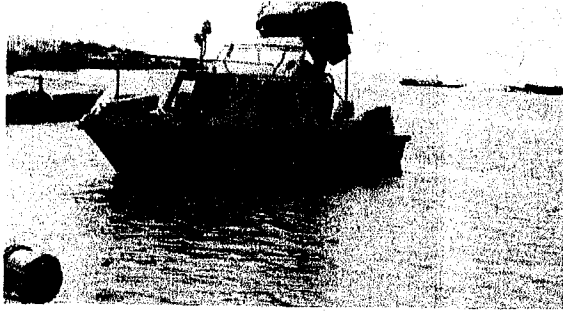

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ফুলুয়ার চরঘাট এর বাঁশেরগাড়া গ্রামে প্যাকেজ ১৮, ১৬, ৯, ৭ ও ৬ পরিদর্শন

Handwritten signatures and marks, including a large '25' in the center.

'কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার যুগুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ডাঙন হতে বামতীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)'

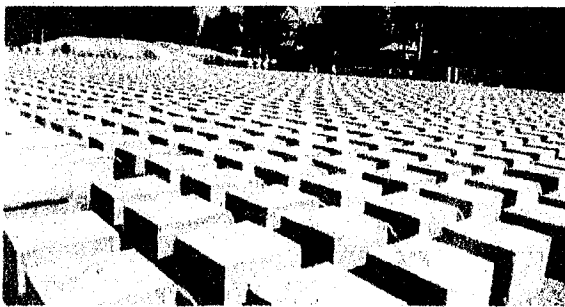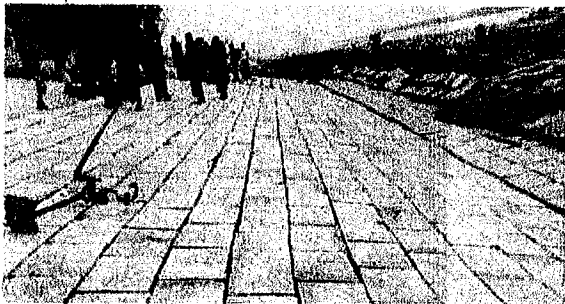


'কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার যুগুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ডাঙন হতে বামতীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)' প্রকল্পের উপকারভোগীদের ও জনপ্রতিনিধিদের সাথে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির মতবিনিময় সভা ও রাজিবপুর অংশের কাজ পরিদর্শন

Handwritten signatures and marks, including a large checkmark and several scribbles, indicating approval or completion of the work.

পঞ্চম অধ্যায় জনপ্রতিনিধি ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের মতামত

৫.০ জনপ্রতিনিধিদের মতামতঃ

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেন। পরিদর্শনকালে স্থানীয় জনসাধারণ এবং জনপ্রতিনিধিগণ মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটিকে জানান যে, নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ বাস্তবায়নের ফলে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে নদী ভাঙ্গন ও বন্যা থেকে বসতবাড়ি, রাস্তা, সরকারি-বেসরকারি অবকাঠামো এবং কৃষি জমি রক্ষা পাবে। তাছাড়া নদী ভাঙ্গন ও বন্যা হতে রক্ষা পাওয়ায় এলাকার আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে। আলোচ্য প্রকল্পের কাজের আওতায় বন্দর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ আব্দুল কাদের, বীর মুক্তিযোদ্ধা প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত কাজে সলুটি প্রকাশ করেন। তিনি জানান, প্রকল্পের উজানে সীমান্ত এলাকা দিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। উল্লিখিত এলাকায় নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ সম্পাদন করার জন্য তিনি মূল্যায়ন কমিটিকে অনুরোধ জানান। পাশাপাশি প্রকল্পের আওতায় রাজিবপুর উপজেলার মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের বাসিন্দা জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত কাজের মান নিয়ে সলুটি প্রকাশ করেন। তিনি জানান, নদী তীর বাস্তবায়নের ফলে মোহনগঞ্জ বাজার ও আশেপাশের বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা পেয়েছে।

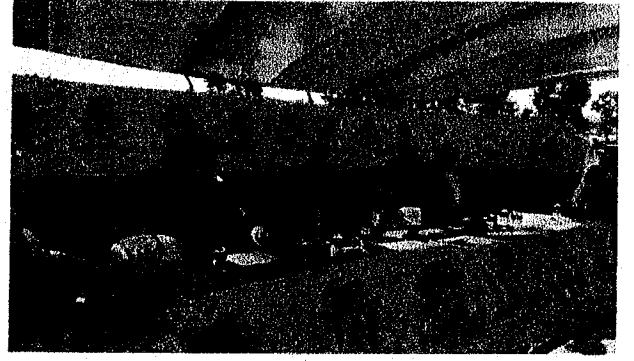

৫.১ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের মতামতঃ

মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পরিদর্শনের সময়ে প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু চ্যালেঞ্জের কথা জানান যা নিম্নরূপঃ


- বর্তমান অর্থবছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- বলদমারা এলাকায় বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের উজানে তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, indicating approval or endorsement of the report.

ষষ্ঠ অধ্যায় উপকারভোগীদের মতামত

৬.০ উপকারভোগীদের মতামতঃ

প্রকল্পের প্রধান উপকারভোগী হলো প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণ। প্রকল্পটি বিগত দুই বছর যাবৎ বাস্তবায়নধীন আছে এবং ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে সম্পন্ন হবে। পরিদর্শনকালে উপকারভোগীদের সাথে আলোচনা করা হয়। ইতোমধ্যে স্থানীয় জনসাধারণ প্রকল্পটির সুফল পেতে শুরু করেছে। প্রকল্প এলাকায় কাজ বাস্তবায়নের ফলে নদী ভাঙ্গনের ঝুঁকি অনেকাংশে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটির পরিদর্শনের সময় এলাকায় বসবাসরত সাধারণ জনগণ জানান, প্রকল্পের আওতায় নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন হওয়ায় তাদের বাড়িঘর, জমি-জমা নদীভাঙ্গনের হতে থেকে রক্ষা পেয়েছে। তবে চলতি বছরে ব্রহ্মপুত্র অববাহিকায় উপর্যুপরি ৫ম দফা বন্যা এবং অতিবৃষ্টিতে নতুন নতুন এলাকা নদী ভাঙ্গনে কবলিত হয়ে পড়েছে। ফলশ্রুতিতে কোন কোন স্থানে বাস্তবায়িত কাজের উজান ও ভাটিতে নদী ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে। ফরে স্থানীয় জনগণ বাস্তবায়িত তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের উজান ও ভাটিতে নদীর তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ জানান। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় এলাকার সাধারণ মানুষ বর্তমান সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। প্রকল্প এলাকায় অর্থনৈতিক অগ্রগতি সাধিত হওয়ায় তারা এই ধরনের প্রকল্প আরও গ্রহণের সুপারিশ করার জন্য মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটিকে অনুরোধ জানান।

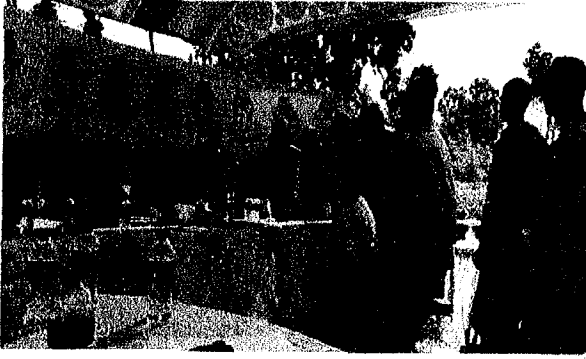

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.

Handwritten signatures and initials.

27

সপ্তম অধ্যায় পর্যবেক্ষণসমূহ

৭.০১ প্যাকেজ ভিত্তিক পর্যবেক্ষণঃ

প্রকল্পটির আওতায় গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্র.	মূল অংশের কাজ	পরিমাণ/ একক	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ডিপিপি তে ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়)	চুক্তিমূল্য	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/পি- ০১	০.০৫০ মিটার	ওটিবিএল-পিডিএল-এনডিআইএল (জেডি), ১০৫ মিডল বাজ্জা, ঢাকা-১২১২	২৮/০১/২০২০	২৮/০১/২০২০	৩১/০৫/২০২১	২০.০০	২৩৬৬.৬৮	২৮.৬৯%	৫৫৪.৬০
২	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/পি- ০২	০.৪৫০ মিটার	স্ট্যান্ডার্ড-এনটিসিএল- (জেডিসিএ), তাহের টাওয়ার(১২তলা), গুলশান, ঢাকা-১২১২	২৮/০৪/২০২০	২৮/০৪/২০২০	৩১/০৫/২০২২	২৩৬৬.৬৮	২৮০১.২৭	৩১.৫১%	৭৯৫.৪০
৩	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/পি- ০৩	০.৫০০ মিটার	স্ট্যান্ডার্ড-এনটিসিএল- (জেডিসিএ), তাহের টাওয়ার(১২তলা), গুলশান, ঢাকা-১২১২	২৯/০৭/২০২০	২৯/০৭/২০২০	৩১/০৫/২০২০	২৮০১.২৭	৩১১৭.০৫	৯.০৪%	১৬৮.৯৮
৪	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/পি- ০৪	০.৩০০ মিটার	টিআই-ইমদাদুল হক (জেডি), শিশু বেকারি,(২য় তলা), বগুড়া।	১৩/০২/২০২০	১৩/০২/২০২০	৩১/০৫/২০২০	৩১১৭.০৫	১৯৬৭.৫৬	২১.৫৮%	২২২.৯২
৫	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/পি- ০৫	০.৫০০ মিটার	ইউএন ট্রেডিং, শ্রেঃ মোঃ জামাল হোসেন, ভাতাশালা, কালিমহল, রাজবাড়ি।	১৯/০৭/২০২১	১৯/০৭/২০২১	২৮/০৬/২০২২	২০০১.৫১	৯২৫.৩১	২১.৫৪%	১৩৯.৫৯
৬	কুড়ি/এডিপি/ রৌমারী/পি- ০৬	০.০৫০ মিটার	ওরিয়েন্ট ট্রেডিং এন্ড বিস্তার লিমিটেড আরএফএল প্রাস্টিক লিঃ (জেডি)	৩০/০৪/২০২০	৩০/০৪/২০২০	৩১/০৫/২০২২	১০২৮.১৪	২৩১১.৩৩	৩২.১৫%	৬৫৬৩.৩৬
৭	কুড়ি/এডিপি/ রৌমারী/পি- ০৭	০.৫০০ মিটার	আরবিএল-পিডিএল (জেডি), ১০৫ মিডল বাজ্জা, ঢাকা	২৩/০২/২০২০	২৩/০২/২০২০	৩১/০৫/২০২২	২৩১১.৩৩	৩০৭৮.১০	২৭.৪৮%	৬৯৭.৪৭
৮	কুড়ি/এডিপি/ রৌমারী/পি- ০৮	০.৪০০ মিটার	স্ট্যান্ডার্ড-সাপি(জেডি), তাহের টাওয়ার(১২তলা), গুলশান, ঢাকা-১২১২	১৯/০১/২০২০	১৯/০১/২০২০	৩৬১/০৫/২০২২	৩০৭৮.৭১	২৪৬২.৬৮	৩২.৬৫%	৬৮৪.৩৬
৯	কুড়ি/এডিপি/ রৌমারী/পি- ০৯	০.৫০০ মিটার	আরবিএল-আরপিএল (জেডি), মধ্য বাজ্জা, ঢাকা	২৯/০৭/২০২০	২৯/০৭/২০২০	৩১/০৫/২০২২	২৪৬২.৬৮	৩০৭৮.৮১	৪৩.৮৬%	১২০৫.৩৭
১০	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/পি- ১০	০.৫০০ মিটার	মেসার্স মালেক আহমদ এন্ড মেসার্স বেনাল কনস্ট্রাকশন, (জেডি) দাদা মোড়, লোহাপাট্টা, কুড়িগ্রাম।	২৭/০২/২০২০	২৭/০২/২০২০	৩১/০৫/২০২০	৩০৭৮.৮১	৩২৩৮.০৬	২৯.৯৩%	৯৩৩.৮৫
১১	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/পি- ১১	০.৫০০ মিটার	মেসার্স মালেক আহমদ এন্ড মেসার্স বেনাল কনস্ট্রাকশন, (জেডি) দাদা মোড়,	২৭/০২/২০২০	২৭/০২/২০২০	৩১/০৫/২০২০	৩২৩৮.০৭	৩২১৫.৯৩	৪২.৯০%	১০৬৬.০৮

ক্র.	মূল অংশের কাজ	পরিমাণ/ একক	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ডিপিপি ভে ব্যয় (প্রাক্কলিত ব্যয়)	চুক্তিমূল্য	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
			লোহাপাটি, কুড়িগ্রাম।							
১২	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/১২	০.৫০০ মিটার	এম এম বিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড- মেসার্স রিমা নির্মাণ সংস্থা, (জেন্ডি), বারিধারা (DOHS), ঢাকা- ১২১২	০৩/০৮/২০২১	০৩/০৮/২০২১	২৮/০৬/২০২২	৩২১৫.৯ ৩	৯৩০.৪৯	৯.২৩%	৪৫.২৪
১৩	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/১৩	০.৪৫০ মিটার	জি ২ জি-ওএমসি- এসএ(জেন্ডি), ইউটিসি বিল্ডিং, পাখপাড়া, ঢাকা।	১৫/০৭/২০২১	১৫/০৭/২০২১	২৮/০৬/২০২২	১০৩৩.৮ ৯	৮৩৪.৯৯	৩.১৭%	০.০০
১৪	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/১৪	০.০৫০ মিটার	মোঃ জামাল হোসেন, নর্থ মাকুলার রোড, ঠাকুরগাও।	১৫/০৭/২০২১	১৫/০৭/২০২১	২৮/০৬/২০২২	৯২৭.৭৮	২৫২.৪৩	১৬.০১%	১৯.০৪
১৫	কুড়ি/এডিপি/ রোমারী/পি- ১৫	০.৫০০ মিটার	মেসার্স তাজ মঞ্জিল, ইয়ামিন রসুল টেমুরী, জিএল রায় রোড, কামাল কাছনা, রংপুর।	১৩/০১/২০২০	১৩/০২/২০২০	৩১/০৫/২০২২	৩২৫.৫২	৩০৮২.৯ ৭	৩০.৮১%	৮০১.৯২
১৬	কুড়ি/এডিপি/ রোমারী/পি- ১৬	০.৫০০ মিটার	এম এম বিল্ডার্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড- শেখ ইমদাদুল হক আল মামুন (জেন্ডি), রোজিনা কন্টেক্স, বড়গাছা, নাটোর।	৩০/০৭/২০২০	৩০/০৭/২০২০	৩১/০৫/২০২০	৩০৮২.৯ ৭	৩০৭৭.৫ ৩	৩৮.৬০%	৭৫৫.৩৮
১৭	কুড়ি/এডিপি/ রোমারী/পি- ১৭	০.৫০০ মিটার	মেসার্স ডন করপোরেশন এন্ড সান ফ্রাউয়ার জেন্ডি, রামপুরা, ঢাকা।	২৭/০২/২০২০	২৭/০২/২০২০	৩১/০৫/২০২২	৩০৭৭.৫ ৩	৩১৫৫.০ ০	২৩.৬৩%	৬৮৩.৪৮
১৮	কুড়ি/এডিপি/ রোমারী/পি- ১৮	০.৫০০ মিটার	স্ট্যান্ডার্ড- সাসি(জেন্ডি), তাহের টাওয়ার (১২তলা), গুলশান, ঢাকা-১২১২	১৯/০২/২০২০	১৯/০২/২০২০	৩১/০৫/২০২২	৩১৫৫.০ ০	৩০৭৭.৬ ০	৫৮.৭৬%	১৬৩৭.৫ ০
১৯	কুড়ি/এডিপি/ রোমারী/পি- ১৯	০.০৫০ মিটার	শহীদ রাহাদার্স- ওএমসি- জি ২ জি(জেন্ডি), ইউটিসি বিল্ডিং, পাখপাড়া, ঢাকা।	২২/০১/২০২০	২২/০১/২০২০	৩১/০৫/২০২২	৩০৭৭.৬ ২	৯২৪.৫৫	৬০.০৩%	৫০০.৩০
২০	কুড়ি/এডিপি/ রোমারী/পি- ২০	৪টি ঘাটলা নির্মাণ	মোঃ হাসিবুল হাসান, রংপুর।	২৭/১০/২০২১	২৭/১০/২০২১	৩১/০৫/২০২০	১৬.০০	১৪.৪০	-	-
২১	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/২১	০.২০০ মিটার	শেখ ইমদাদুল হক আল মামুন (জেন্ডি), রোজিনা কন্টেক্স, বড়গাছা, নাটোর।	১২/০৭/২০২১	১২/০৭/২০২১	৩১/০৫/২০২২	৬৫৮.০১	৫৮৪.৯০	২৮.৪৮%	১২৮.৬৬
২২	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/ ২২	০.২০০ মিটার	কে কে ই-ইউবি-এমসিই (জেন্ডি), ধাপ, রংপুর।	১৮/০৭/২০২১	১৮/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	৬৫৮.৪৫	৫৮৪.৯০	২৮.০৩%	১৬২.৮০
২৩	কুড়ি/এডিপি/ রাজিবপুর/২৩	০.২০০ মিটার	মেসার্স রূপান্তর, মাল চিকলি ভাটা রোড, গঙ্গাচড়া রোড, রংপুর। পূর্বতন ক্রিয়াকারী এমসি রোড, বেতপাটি, রংপুর।	১৫/০৭/২০২১	১৫/০৭/২০২১	২৮/০৬/২০২২	৬৫৭.৭৯	৫২৪.৯০	২৭.৮৭%	১৬১.৮৭

~~A~~ ~~H~~ ~~S~~ ~~N~~ ~~D~~ ~~V~~ ~~J~~ ~~R~~ ~~P~~ ~~T~~

‘পরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা’ উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে মুন্সিগঞ্জ নদী ও রাজিবপুর উপজেলার সবার (মোট ১০০০) হতে মোট ১০০০ বর্গ ফুট প্রকল্পের নামের মাধ্যমে হতে বাস্তবায়ন (১০ মাসের মধ্যে)।

ক্র.	মূল অংশের কাজ	পরিমাণ/একক	ঠিকাদারের নাম	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ডিপিপি তে ব্যয় (প্রাকল্পিত ব্যয়)	চুক্তিমূল্য	বাস্তব অগ্রগতি	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৪	কুড়ি/এডিপি/রাজিবপুর/২৪	০.২০০ মিটার	মেসার্স আমিন এন্ড কোং, ১৮ গগনবাবু রোড, খুলনা।	১৮/০৭/২০২১	১৮/০৭/২০২১	৩০/০৬/২০২২	৬৫৮.২২	৫৮৪.৯০	২৮.৩০%	১৬৪.৩৯
২৫	কুড়ি/এডিপি/রাজিবপুর/২৫	০.২০০ মিটার	টিটিএসএল, আকরাম চাঁদপুর(৫ম তলা), শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম স্মারক, বিজয়নগর, ঢাকা-১০০০	১৫/০৭/২০২১	১৫/০৭/২০২১	২৮/০৬/২০২২	৬৫৮.০৮	৫৮৪.৯০	১৬.১৪%	৬৭.৯৫

৭.১। রক নির্মাণ, প্লেসিং ও ডাম্পিং সংক্রান্ত তথ্যঃ

ক্রঃ	অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী		চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত অবস্থা		চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা
	রক সাইজ	রকের সংখ্যা	রকের সংখ্যা	এ পর্যন্ত নির্মিত	ডাম্পিংকৃত রকের পরিমাণ	
১.	৪৫*৪৫*৩০ ঘনসেমি	৬৩৩১৮৬	৬২৫১০১	৩৩২১৭৪	১৫০৩০	২৯২৯২৭
২.	৩৫*৩৫*৩৫ ঘনসেমি	১৮৯৪৫৯৩	১৪০২৬৪৫	৫৫৯৭১৩	৪৫৬২৫০	৮৪২৯৩২
৩.	৪৫*৪৫*৪৫ ঘনসেমি	১৩৮২৩১৭	১৪০২৬৪৫	৫৫৯৭১৩	৪৫৬২৫০	৮৪২৯৩২
মোট		৩৯১০০৯৬	৩৯২২৩৩৯	১৩৩০৮২৬	৪৭১৫৪	২৫৯১৫১৩

৭.২। জিওবাগ প্রস্তুত ও ডাম্পিং সংক্রান্ত তথ্যঃ


অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী	প্রকৃত অবস্থা			চলতি অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা
জিও বাগের সংখ্যা	চুক্তি অনুযায়ী জিও বাগের সংখ্যা	প্রস্তুতকৃত জিও বাগের সংখ্যা	ডাম্পিংকৃত সংখ্যা	
২০০৭০৫৫	২০৪২১৭৩	৭৯১৭৪৭	৭৯১৭৪৭	১২৫০৪২৬

প্রকল্পে স্থাপিত বিভিন্ন সাইজের রক যেমন ৪৫*৪৫*৪৫ ঘন সেমি, ৩৫*৩৫*৩৫ ঘন সেমি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বাপাউবো এর ল্যাব থেকে পরীক্ষা করা হয়েছে। পরীক্ষায় Concrete রক এর মান সন্তোষজনক বিবেচিত হয়েছে।

৭.৩। কমিটির পর্যবেক্ষণঃ

পরিদর্শনকালে দেখা যায় প্রকল্পের কাজ প্রায় ৩২.৭৩% সমাপ্ত হয়েছে। কাজ সমূহ সমাপ্তির ফলে রৌমারী ও রাজিবপুর উপজেলার রক্ষপুত্র নদ সংলগ্ন রাস্তা, বিদ্যমান বসতবাড়ি নদী ভাঙান হতে রক্ষা পেয়েছে। কমিটির আহ্বায়ক স্লোপ তৈরির বিষয়ে জানতে চাইলে নির্বাহী প্রকৌশলী জানান, স্লোপ তৈরীর কাজে ড্রোজার ব্যবহারের মাধ্যমে কম্প্যাকশন করা হবে বলে উল্লেখ করেন। ডিপিপিভে মোট প্যাকেজ ২৫টি। ৩০ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রদান করা ১২টি প্যাকেজ সমাপ্ত হবে মর্মে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী উল্লেখ করেন।

মহাব্যক্তি মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক সাইট পরিদর্শনের সময় দেখা যায়, আনোয়ার, প্রিমিয়াস ও ফ্রেশ ব্রান্ডের সিমেন্ট দিয়ে Concrete রকের Casting চলছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৩২% কাজ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সাইটে সিমেন্টের কোন Test Report নাই। এছাড়া নির্মাণ কাজে ব্যবহারকৃত বালির F.M নির্ধারিত ১.৫ এর চেয়ে কম প্রতীয়মান হয়েছে। নির্মাণ কাজে ব্যবহারকৃত নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান বুয়েট অথবা বুয়েট এর পরীক্ষাগার থেকে পরীক্ষা করা বাঞ্ছনীয়। কনক্রীট ঢালাই এর প্লাস্টফর্ম মানসম্মত মনে হয়নি। ফলে Concrete রকের Finishing আশানুরূপ হচ্ছে না। প্রকল্প সাইটে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট ও নির্মাণ সামগ্রী অর্থাৎ Mixer Machine ও স্টোন চিপসের ঘাটতি রয়েছে। আগামী বর্ষা মৌসুমের পূর্বে কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট ও পর্যাপ্ত নির্মাণ সামগ্রী সাইটে মজুত করা প্রয়োজন।




প্রকল্পের সাইট অত্যন্ত দুর্গম এলাকায়। প্রকল্প সাইট পরিদর্শন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের স্পিড বোট থাকা প্রয়োজন। প্রকল্প সাইটের কাজ সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডে কার্যসহকারীর স্বল্পতা রয়েছে। নির্মাণ কাজের সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য কুড়িগ্রাম পানি উন্নয়ন বোর্ডে কার্যসহকারী পদায়ন করা প্রয়োজন। ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীরে কুড়িগ্রাম জেলার অংশের মোট দৈর্ঘ্য ৪৩.০০ কিমি। ২০১৬ সালে ২.০০ কিমি অংশে স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে চলমান প্রকল্পের আওতায় ৮.৩ কিমি কাজ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সুতরাং এলাকার মানুষের ধরবাড়ী, জমি-জমা রক্ষার্থে অবশিষ্ট ৩৩.০০ কিমি স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের জন্য ভবিষ্যতে আরও উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে পরিদর্শনে দৃষ্ট হয়।

৭.৪। প্রকল্প সংশোধনের কারণঃ

০৬-০৫-২০২০ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রকল্পটির উপর স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি ২০১৭-১৮ সালের প্রটো সিডিউল অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত যা ০৯-০৪-২০১৯ তারিখ একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় হতে গত ০৮-০৭-২০১৯ তারিখ প্রকল্পটির প্রশাসনিক আদেশ জারি হয়। ইতিমধ্যে বাপাউবোর রোট সিডিউল দুই বার পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে ১৯টি প্যাকেজের মধ্যে ১৫ টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়; যার ব্যয় প্রায় ৪০৯৬০.৫৩ লক্ষ টাকা। সাশ্রয়ীকৃত অর্থ ৬৫৩১.৭১ লক্ষ টাকার মাধ্যমে অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের মধ্যে ২টি প্যাকেজের ক্ষেত্রে সমন্বয় করা গেলেও বাকি ২টি প্যাকেজের জন্য অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয়। এছাড়া, প্রকল্পটির মেয়াদকাল এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত ছিল। প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করতে ন্যূনতম ১ (এক) বছর সময়সীমা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন দেখা দেয়।


প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৮০৪২.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ এপ্রিল ২০১৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি হয়েছে ১১৯.০০ লক্ষ টাকা (০.২৪৮%)। প্রস্তাবিত ১ম সংশোধিত আরডিপিপি ২২/০৩/২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়।




অষ্টম অধ্যায় সুপারিশসমূহ

৮.০। কমিটির সুপারিশঃ


- ডিপিপি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকল্পে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হতে হবে;
- যথাযথ Specification এবং Design অনুসরণ করে কাজ বাস্তবায়নের বিষয়টি প্রকল্প কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করবে;
- ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করতে হলে কাজের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে;
- নির্দিষ্ট সময়ে কাজটি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট এবং পর্যাপ্ত নির্মাণ সামগ্রী প্রকল্প সাইটে মজুত করতে হবে;
- মানসম্মত কাজের লক্ষ্যে নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগণ বুয়েট অথবা ব্লুয়েট এর ল্যাবরেটরী থেকে পরীক্ষা করে প্রাপ্ত রিপোর্ট সাইটে সংরক্ষণ করতে হবে;
- Specification অনুযায়ী নির্মাণ কাজে ব্যবহারকৃত বালির FM নিশ্চিত করতে হবে;
- কনক্রিট কাস্টিং এর প্র্যাটফর্ম যথাযথ হতে হবে যেন ব্লকের ফিনিশিং মানসম্মত হয়;
- রাজিবপুর উপজেলার জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর কাজ সন্তোষজনক হলেও Concrete ব্লকের কাজের গতি বৃদ্ধি করতে হবে;
- ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন বিধায় স্পিডবোট ছাড়া প্রকল্প এলাকাসমূহ পরিদর্শন ও তদারকি করা প্রায় অসম্ভব। যেহেতু প্রকল্পে কোন জলযানের বরাদ্দ রাখা নেই, সেহেতু পরিচালন বাজেট হতে স্পিডবোট ক্রয় করা যেতে পারে;
- প্রকল্প সাইটে প্রয়োজন অনুযায়ী কার্য সহকারী নেই। তাই বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের যেসব বিভাগে কাজের পরিধি কম, সেখান হতে কার্য সহকারী প্রকল্প সাইটে নিয়োজিত করা যেতে পারে;
- প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কাজপূর্ব এবং কাজ পরবর্তী ছবি সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। এতে বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করা যায়;
- ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্পে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তর থেকে প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে;
- প্রকল্পটি ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন এলাকায়। প্রকল্প এলাকায় মালামাল ও যন্ত্রপাতি পরিবহন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ। বাস্তবতার আলোকে প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা যেতে পারে ;
- নির্মাণ কাজের গুনগতমান নিশ্চিত করণ এবং নির্দিষ্ট সময়ে প্রকল্পের কাজ সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নির্মাণ কাজ নিবিড় মনিটরিং করতে হবে;
- ব্রহ্মপুত্র অংশের বাম তীরে কুড়িগ্রাম জেলার অবশিষ্ট ৩৩.০০ কিমি দৈর্ঘ্যে স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।






30/12/2021
আবুজোয বর্মন
প্রকল্প পরিচালক
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
সিঙ্গাইল জেলা পরিষদ, বাগাইচা
ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি



30/12/2021
মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন
নির্বাহী প্রকৌশলী
কৃষ্টিগ্রাম পল্লী বিভাগ, বাগাইচা, কৃষ্টিগ্রাম
ও সদস্য, মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি



30/12/2021
মোঃ আব্দুল হক
প্রকল্প পরিচালক ও ভ্রাম্যভ্রমণ প্রকৌশলী
রংপুর পল্লী সার্কেল-১,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর।



30/12/2021
মোহাম্মদ মোবাহশেদুল ইসলাম
উপসচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সদস্য সচিব
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি



30/12/2021
ড. লায়লা আখতার
উপপ্রধান
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
পরিকল্পনা কমিশন ও সদস্য,
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি



30/12/2021
মোঃ মাহমুদ হাসান
উপসচিব, উন্নয়ন-২ শাখা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ও সদস্য,
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি



30/12/2021
মুহাম্মদ শাহাদাত হোসাইন
পরিচালক (উপসচিব)
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ ও সদস্য
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি


30/12/2021
শিবির বিচিত্র বস্তুমা
মুদ্রাসচিব, (সেচ অনুবিভাগ)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
পরিকল্পনা কমিশন ও সহ আয়োজক,
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি


30/12/2021
মোহাম্মদ মুহম্মদ রহমান, পিএ
মুদ্রাসচিব, পরিকল্পনা-০২ অধিশাখা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ও সদস্য,
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি


30/12/2021
মহাঃ এনাঙ্গুল হক
মুদ্রাসচিব
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ,
পরিকল্পনা কমিশন ও মুদ্রা আয়োজক,
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি


30/12/2021
এস. এম. রেজাউল মোস্তফা কামাল
মুদ্রাসচিব (পরিকল্পনা)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও আয়োজক
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি


30/12/2021
মোঃ মোকন উদ-দৌলা
পরিচালক সচিব (উন্নয়ন)
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও উপদেষ্টা
মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি

	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25
Rev	3616250.00	1897212.00	4691009.00	710983.00	436065.00	0.00
Cap	61700000.00	559699481.00	1794800000.00	999000000.00	999884094.00	216901408.00
Total	65316250.00	561596693.00	1799491009.00	999710983.00	1000320159.00	216901408.00

Deputy Director
Regional Accounting Center
BWDB, Rangpur.

SV DEBPP - GOE OF
22426810000

Kurigram O&M Division

Period: 02/07/2019 To 30/06/2020

Head of Expenditures

	Month Exp. GOB	YTD Exp. GOB	Year to Date Budget	Budget Balance
3111332-Roumary- Rajibpur-Honorium	0.00	76,500.00 ✓	150,000.00	73,500.00
3211109-Roumary- Rajibpur-Labour Wages	113,050.00	113,050.00 ✓	150,000.00	36,950.00
3211111-Roumary-Conference.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00
3231101-Roumary-Ext.Training.	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00
3241101-Roumary-Int.Tra.Exp.	37,700.00	37,700.00 ✓	100,000.00	62,300.00
3243101-Roumary- Rajibpur-Petrol & Lubricant	28,954.00	100,000.00 ✓	100,000.00	0.00
3255104-Roumary- Rajibpur-Stationary	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
3258107-Roumary- Rajibpur-BWDB Building	0.00	500,000.00 ✓	500,000.00	0.00
4111201-Roumary- Rajibpur-Protective Works.	38,375,577.00	61,700,000.00	61,700,000.00	0.00
4112101-Roumary- Rajibpur-Motorian and Motor Cycle	0.00	300,000.00 ✓	5,800,000.00	5,500,000.00
4112102-Roumary- Rajibpur-Speed Boat	2,489,000.00	2,489,000.00 ✓	2,500,000.00	11,000.00
TOTAL PROJECT EXPENDITURE	41,044,281.00	65,316,250.00	75,000,000.00	9,683,750.00
3111332-Roumary- Rajibpur-Honorium	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
3211109-Roumary- Rajibpur-Labour Wages.	0.00	150,000.00	0.00	-150,000.00
3211111-Roumary- Rajibpur-Conference.	0.00	50,000.00	0.00	-50,000.00
3231101-Roumary- Rajibpur-Ext. Training.	0.00	3,750,000.00	0.00	-3,750,000.00
3241101-Roumary- Rajibpur-Tr. Exp.	100,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
3243101-Roumary- Rajibpur-Petrol and Lubricant.	-100,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
3255104-Roumary- Rajibpur-Stationary	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
3258107-Roumary- Rajibpur-Building Repair.	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
4111201-Roumary- Rajibpur-Protective Works.	0.00	61,700,000.00	0.00	-61,700,000.00
4112101-Roumary- Rajibpur-Motorian and Motor Cycle	0.00	5,800,000.00	0.00	-5,800,000.00
4112102-Roumary- Rajibpur-Speed Boat.	0.00	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00
Total Fund	0.00	-75,000,000.00	0.00	75,000,000.00

RECORD PAGE

Statement of Development Project Expenditures

By Detail PP - GOB Only

22428810000

Kurigram O&M Division

Period: 02/07/2020 To 30/06/2021

Head of Expenditures	Month Exp. GOB	YTD Exp. GOB	Year to Date Budget	Budget Balance
3111332-Roumary- Rajibpur-Honorium	159,500.00	200,000.00	200,000.00	0.00
3211109-Roumary- Rajibpur-Labour Wages	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
3211111-Roumary-Conference.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00
3211125-Roumary-Rajibpur-Publicity and Advertisemen	98,955.00	98,955.00	100,000.00	1,045.00
3231101-Roumary-Ext. Training.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
3241101-Roumary-Int. Tra. Exp.	32,483.00	200,000.00	200,000.00	0.00
3243101-Roumary- Rajibpur-Petrol & Lubricant	202,293.00	400,000.00	400,000.00	0.00
3255104-Roumary- Rajibpur-Stationary	199,000.00	199,000.00	200,000.00	1,000.00
3257104-Roumary- Rajibpur-Survey	299,848.00	299,848.00	300,000.00	152.00
3258101-Roumary- Rajibpur-Motor Vehicle	149,529.00	199,409.00	200,000.00	591.00
3258107-Roumary- Rajibpur-BWDB Building	0.00	1,299,481.00	1,500,000.00	200,519.00
4111201-Roumary- Rajibpur-Protective Works.	125,573,152.00	558,400,000.00	558,400,000.00	0.00
TOTAL PROJECT EXPENDITURE	126,714,760.00	561,598,693.00	562,100,000.00	503,307.00
3111332-Roumary- Rajibpur-Honorium	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
3211109-Roumary- Rajibpur-Labour Wages.	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
3211111-Roumary- Rajibpur-Conference.	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
3211125-Roumary-Rajibpur-Publicity and Advertisemen	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
3231101-Roumary- Rajibpur-Ext. Training	100,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
3241101-Roumary- Rajibpur-Tr. Exp.	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
3243101-Roumary- Rajibpur-Petrol and Lubricant.	0.00	400,000.00	0.00	-400,000.00
3243102-Roumary- Rajibpur-Gas&Fuel	-100,000.00	0.00	0.00	0.00
3255104-Roumary- Rajibpur-Stationary	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
3257104-Roumary- Rajibpur-Survey	0.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
3258101-Roumary- Rajibpur-Repair for Motor.	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
3258107-Roumary- Rajibpur-Building Repair.	0.00	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
4111201-Roumary- Rajibpur-Protective Works.	125,500,000.00	558,400,000.00	0.00	-558,400,000.00
4112101-Roumary- Rajibpur-Motorian and Motor Cycle	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00

Statement of Development Project Expenditures

By Detail PP - GOB Only

22428810000

Kurigram O&M Division

Period: 02/07/2021 To 30/06/2022

Head of Expenditures

	Month Exp. GOB	YTD Exp. GOB	Year to Date Budget	Budget Balance
3111332-Roumary- Rajibpur-Honorium	1,347,863.00	1,452,000.00 ✓	1,452,000.00	0.00
3211109-Roumary- Rajibpur-Labour Wages	92,625.00	441,000.00 ✓	587,000.00	146,000.00
3211111-Roumary-Conference.	399,780.00	399,780.00 ✓	400,000.00	220.00
3211125-Roumary-Rajibpur-Publicity and Advertisemen	50,000.00	199,882.00 ✓	200,000.00	118.00
3241101-Roumary-Int.Tra.Exp.	300,000.00	300,000.00 ✓	300,000.00	0.00
3243101-Roumary- Rajibpur-Petrol & Lubricant	190,860.00	500,000.00 ✓	500,000.00	0.00
3255104-Roumary- Rajibpur-Stationary	299,960.00	599,604.00 ✓	600,000.00	396.00
3257104-Roumary- Rajibpur-Survey	698,743.00	698,743.00 ✓	700,000.00	1,257.00
3258101-Roumary- Rajibpur-Motor Vehicle	75,000.00	100,000.00 ✓	100,000.00	0.00
4111201-Roumary- Rajibpur-Protective Works.	350,775,000.00	1,794,800,000.00 ✓	1,794,800,000.00	0.00
TOTAL PROJECT EXPENDITURE	354,229,831.00	1,799,491,009.00	1,799,639,030.00	147,991.00

TOTAL PROJECT EXPENDITURE

3111332-Roumary- Rajibpur-Honorium	0.00	1,452,000.00	0.00	-1,452,000.00
3211109-Roumary- Rajibpur-Labour Wages.	0.00	587,000.00	0.00	-587,000.00
3211111-Roumary- Rajibpur-Conference.	0.00	400,000.00	0.00	-400,000.00
3211125-Roumary-Rajibpur-Publicity and Advertisemen	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
3241101-Roumary- Rajibpur-Tr. Exp.	300,000.00	300,000.00	0.00	-300,000.00
3243101-Roumary- Rajibpur-Petrol and Lubricant.	0.00	500,000.00	0.00	-500,000.00
3255104-Roumary- Rajibpur-Stationary	0.00	600,000.00	0.00	-600,000.00
3257104-Roumary- Rajibpur-Survey	0.00	700,000.00	0.00	-700,000.00
3258101-Roumary- Rajibpur-Repair for Motor.	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
4111201-Roumary- Rajibpur-Protective Works.	350,775,000.00	1,794,800,000.00	0.00	1,794,800,000.00
4112101-Roumary- Rajibpur-Motorjan and Motor Cycle	-5,500,000.00	0.00	0.00	0.00
Total Fund	-345,575,000.00	-1,799,639,000.00	0.00	1,799,639,000.00

Unspent Balance

-8,654,831.00	147,991.00	799,639,000.00	799,786,991.00
----------------------	-------------------	-----------------------	-----------------------

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

Rangpur RAC

Statement of Development Project Expenditures

By Detail PP - GOB Only

22428810000

Kurigram O&M Division

Period: 02/07/2022 To 30/06/2023

Head of Expenditures	Month Exp. GOB	YTD Exp. GOB	Year to Date Budget	Budget Balance
3211109-Roumary- Rajibpur-Labour Wages	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
3241101-Roumary-Int. Tra. Exp.	197,043.00	197,043.00	200,000.00	2,957.00
3243102-Roumary- Rajibpur-Gas&Fuel	274,637.00	274,637.00	288,000.00	13,363.00
3258107-Roumary- Rajibpur-BWDB Building	99,303.00	99,303.00	100,000.00	697.00
4111201-Roumary- Rajibpur-Protective Works.	250,685,911.00	999,000,000.00	999,000,000.00	0.00
TOTAL PROJECT EXPENDITURE	251,396,894.00	999,710,983.00	999,728,000.00	17,017.00
3211109-Roumary- Rajibpur-Labour Wages.	0.00	140,000.00	0.00	-140,000.00
3241101-Roumary- Rajibpur-Tr. Exp.	0.00	200,000.00	0.00	-200,000.00
3243102-Roumary- Rajibpur-Gas&Fuel	88,000.00	288,000.00	0.00	-288,000.00
3258107-Roumary- Rajibpur-Building Repair.	100,000.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
4111201-Roumary- Rajibpur-Protective Works.	249,750,000.00	999,000,000.00	0.00	-999,000,000.00
Total Fund	-249,938,000.00	-999,728,000.00	0.00	999,728,000.00
Unspent Balance	-1,458,894.00	17,017.00	999,728,000.00	999,745,017.00

02/07/2023

Deputy Director

Rangpur RAC

26/06/2023

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

Rangpur RAC

Statement of Development Project Expenditures

By Detail PP - GOB Only

22428810000

Kurigram O&M Division

Period: 02/07/2023 To 30/06/2024

Head of Expenditures	Month Exp. GOB	YTD Exp. GOB	Year to Date Budget	Budget Balance
3111332-Rourmary- Rajibpur-Honorium	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
3241101-Rourmary-Int.Tra.Exp.	40,115.00	260,000.00	260,000.00	0.00
3243102-Rourmary- Rajibpur-Gas&Fuel.	106,065.00	106,065.00	248,000.00	141,935.00
3258107-Rourmary- Rajibpur-BWDB Building	99,441.00	99,441.00	100,000.00	559.00
4111201-Rourmary- Rajibpur-Protective Works.	271,873,015.00	999,784,657.00	1,049,300,000.00	49,515,343.00
TOTAL PROJECT EXPENDITURE	272,188,636.00	1,000,320,163.00	1,049,978,000.00	49,657,837.00
3111332-Rourmary- Rajibpur-Honorium	0.00	70,000.00	0.00	-70,000.00
3241101-Rourmary- Rajibpur-Tr. Exp.	0.00	260,000.00	0.00	-260,000.00
3243102-Rourmary- Rajibpur-Gas&Fuel	0.00	248,000.00	0.00	-248,000.00
3258107-Rourmary- Rajibpur-Building Repair.	0.00	100,000.00	0.00	-100,000.00
4111201-Rourmary- Rajibpur-Protective Works.	88,745,000.00	1,049,300,000.00	0.00	1,049,300,000.00
Total Fund	-88,745,000.00	-1,049,978,000.00	0.00	1,049,978,000.00
Unspent Balance	-183,443,636.00	49,657,837.00	749,978,000.00	799,635,837.00

Deputy Director

Rangpur RAC

30/06/2024

১
বিত্তারিত বিতরণ এবং ব্যয়ের প্রতিবেদন

২০২৪-২৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ ১৪৭ - পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রাতিষ্ঠানিক কোড	পরিচালন ইউনিট	মাঠ অফিস	অর্থনৈতিক কোড	বিবরণ	(অংকসমূহ টাকায়)					
					অনুমোদিত					অননুমোদিত
					বিতরণ	প্রত্যাহার	মোট	প্রকৃত ব্যয়	অবশিষ্ট	বিতরণ

১৪৭০১

সচিবালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২২৪২৮৮১০০

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চরঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘার পাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাত

২২৪২৮৮১০০০০০০০০

কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চরঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘার পাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত দ্বা

৪১১১

ভবন ও স্থাপনাসমূহ

৪১১১৩১৭

অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা

২,৩২,০০০

০

২,৩২,০০০

০

২,৩২,০০০

৪১১১৩২১

ধাঁধ

২৩৭৭,৬৮,০০০

০

২৩৭৭,৬৮,০০০

২১৬৯,০১,৪০৮

২০৮,৬৬,৫৯২

উপমোট- ভবন ও স্থাপনাসমূহ :

২৩৮০,০০,০০০

০

২৩৮০,০০,০০০

২১৬৯,০১,৪০৮

২১০,৯৮,৫৯২

মোট :

২৩৮০,০০,০০০

০

২৩৮০,০০,০০০

২১৬৯,০১,৪০৮

২১০,৯৮,৫৯২

মোট- কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে
ফুলুয়ার চরঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘার পাড়া) হতে

২৩৮০,০০,০০০

০

২৩৮০,০০,০০০

২১৬৯,০১,৪০৮

২১০,৯৮,৫৯২

মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের জাশন হতে বামতীর
সংরক্ষণ (০১/০৪/২০১৯-৩০/০৬/২০২৫) (১ম সংশোধিত)

অনুমোদিত :

মোট- সচিবালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় :

২৩৮০,০০,০০০

০

২৩৮০,০০,০০০

২১৬৯,০১,৪০৮

২১০,৯৮,৫৯২

মোট- পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় :

২৩৮০,০০,০০০

০

২৩৮০,০০,০০০

২১৬৯,০১,৪০৮

২১০,৯৮,৫৯২

